

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 01702

DATA: 01/04/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 01/04/2025

Credor...: V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUC. CNPJ: 13.958.944/0001-18 Cod: 1964

Endereço: RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA CRE CHE MÃE ZEFA. CONFORME CONTRATO 047/2024.

Valor **152.867,14**

(cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 152.867,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310	/ 1	EX	022002	12.361.1004.2318.0000	4.4.90.51.91 RR\$ 152.867,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 152.867,14
TOTAL					RR\$ 152.867,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 152.867,14

Despesa Líquida: **RR\$ 152.867,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 152.867,14
TOTAL. . .			RR\$ 152.867,14

01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 227319133
CNPJ 13.958.944/0001-18
Nome favorecido V DE S CAMPOS LOCACAO DE MAQUINAS E CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 152.867,14
Destinação 0
Data transferência 01/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DC9C12C4DC51124

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	01/04/2025 14:55:22
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	01/04/2025 14:55:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1231008 / 1	Processo:		
Ficha	8004	Data	31/03/2025	Requi	Venci	31/03/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIA 9581044/0001-18			Cod	1964	
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO		SN	PAULISTANA	64750-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CONFORME CONTRATO 047/2024.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

EX			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	220000
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	Liqui	152867,14
12.361.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
220.000,00	152.867,14	152.867,14	67.132,86

152.867,14 cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos *****

Autorizado

31/03/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

31/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	1231008		Processo:	
Ficha	8004	Data	31/12/2024	Requi	Fonte: 00	
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M			C.N.P.J.:	13.958.944/0001-18	Cod 1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO			SN	PAULISTANA	64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA. CONFORME CONTRATO 047/2024.

Fonde de Recurso STN:

1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Bruto	220000
02	OBRAS EM ANDAMENTO	Desc	0
4.4.90.51.91	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	Liqui	220000
12.361.1004.2318.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	888.702,52	220.000,00	1.108.702,52
220.000,00 duzentos e vinte mil reais *****			

Autorizado


31/12/2024


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

31/12/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 – CENTRO
QUEIMADA NOVA – PI CEP 64758-000

C.I Nº153P/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 31 de dezembro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 152.867,14 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos0)** para a razão social **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUC.**, CNPJ: 13.958.944/0001-18, situado a Rua Projetada cinquenta e cinco, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEF. CONFORME CONTRATO 04/2024.**

Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% – Conta: 16291-4

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente,

Edleusa Dias Amorim

Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000000216

Data e Hora de Emissão
31/03/2025 10:08

Código de Verificação
fcacf2e6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA**
CPF/CNPJ: **13.958.944/0001-18** Inscrição Municipal: **20337**
Endereço: **RUA PARANA, 920 - MANINHO - CEP: 64750-000**
Município: **Paulistana** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**
CPF/CNPJ: **41.522.202/0001-80**
Endereço: **RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495 - CENTRO - CEP: 64758-000**
Município: **Queimada Nova** UF: **PI** Email: **financeiroqn@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 152.867,1400	Total R\$ 152.867,14
	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MAE ZEFA CHARLES DA SILVA DOURADO:00998359327 8359327 Assinado de forma digital por CHARLES DA SILVA DOURADO:00998359327 Data: 2025.03.31 15:52:23 -03'00'			
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152.867,14 VALOR LÍQUIDO: R\$ 152.867,14				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 152.867,14	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS:	R\$ 3.057,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: Sem incidência no município de Paulistana
CNAE: 4120-4/00-00

Local da Prestação do Serviço: Queimada Nova/PI
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: Construção de edifícios



V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODÓVIAS LTDA
CNPJ: 13.958.944/0001-18
Obr: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Local da obra: Sede Do Município

Contrato
CNPJ: 13.958.944/0001-18
Boletim de medição atual

Valor do contrato

Modalidade
Endereço
Período da Medição

Executado na MED. 01 (29,57%)

Concorrência - 003.2024
RUA EDVALDO BERNARDES, N° 10, CENTRO - PAULISTANA PI

de 07/02/2025 até 25/03/2025

Termínio Previsto
Data da Medição

07/05/2025
25/03/2025

43 dias
Prazo para conclusão da obra

46 dias
Dias corridos desde o início da obra

47 dias

Acumulado até a MED. 01 (29,57%)

152.867,14

152.867,14

517.046,91

517.046,91

517.046,91

517.046,91

517.046,91

517.046,91

517.046,91

517.046,91

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%

33,33%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

66,67%

66,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00



V DE S CAMPOS,LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Obr.: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Local da obra: Sede Do Município

Contrato

CNPJ 13.958.944/0001-18

Boletim de medição atual

Valor do contrato

Modalidade

MED. 01

Endereço

Período da medição

Execução na MED. 01 (29,57%)

Concorrência - 003.2024

RUA EDVALDO BERNARDES, N° 10, CENTRO - PAULISTANA PI

de 07/02/2025 até 25/03/2025

Acumulado até a MED. 01 (25,57%)

Medição anterior

Início da obra

07/02/2025

Das corridas desde o início da obra

46 dias

A executar (70,43%)

Termino Previsto

07/05/2025

Das corridas desde o início da obra

46 dias

A executar (70,43%)

Data da Medição

25/03/2025

Prazo para conclusão da obra

43 dias

R\$ 364.179,77

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA N° 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)			VALORES C/ BDI (R\$)			PERCENTUAIS (%)		
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE
03.05.01	LASTRO EM CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - ESPESSURA DE 5,0 CM	M²	10,43			10,43	R\$ 11.322,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.322,70	0,00%
03.05.02	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADAS 35X35 CM	M2	15,08			15,08	R\$ 1.078,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.078,82	0,00%
03.05.03	PISO EM GRANILITE, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMETOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	M2	193,31			193,31	R\$ 25.397,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.397,07	0,00%
03.05.04	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP=10,0CM	M3	3,15			3,15	R\$ 3.660,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.660,02	0,00%
03.06	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 66.382,25	R\$ -	R\$ 39.828,23	R\$ 26.554,02	60,00%
03.06.01	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO CERÂMICO E=9,0 CM	M2	474,43	284,65		189,78	R\$ 66.382,25	R\$ -	R\$ 39.828,23	R\$ 26.554,02	60,00%
03.07	INSTALAÇÕES						R\$ 74.915,81	R\$ -	R\$ 19.459,19	R\$ 55.456,62	25,97%
03.07.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL						R\$ 25.133,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.133,88	0,00%
03.07.01.01	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 228,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,76	0,00%
03.07.01.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 661,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,50	0,00%
03.07.01.03	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS, 0,4 X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 495,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,56	0,00%
03.07.01.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	444,40			444,40	R\$ 1.653,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,17	0,00%
03.07.01.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	640,20			640,20	R\$ 3.495,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.495,49	0,00%
03.07.01.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	165,00			165,00	R\$ 2.135,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,10	0,00%
03.07.01.07	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	45,00			45,00	R\$ 832,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 832,05	0,00%
03.07.01.08	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00			3,00	R\$ 107,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,91	0,00%
03.07.01.09	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	15,00			15,00	R\$ 313,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,20	0,00%
03.07.01.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	13,00			13,00	R\$ 175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,11	0,00%
03.07.01.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	33,00			33,00	R\$ 700,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,92	0,00%
03.07.01.12	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	11,00			11,00	R\$ 137,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,72	0,00%
03.07.01.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	5,28			5,28	R\$ 522,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,93	0,00%
03.07.01.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF_08/2023	M3	5,28			5,28	R\$ 133,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,43	0,00%
03.07.01.15	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM), AF_09/2023	UN	1,00			1,00	R\$ 39,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,81	0,00%
03.07.01.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 58,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,76	0,00%



V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE
RODUVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE
GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Local da obra: Sede Do Município

Contrato:

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Boletim de medição atual

Valor do
contrato

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 01

Municipalidade

Enseorego

Período da
Medição

Executado na
MED. 01 (29,57%)

Concorrência - 003.2024

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

de 07/02/2025 até 25/03/2025

Das corridas desde
a medição anterior

Início da obra

07/02/2025

47 dias

Acumulada até a
MED. 01 (25,57%)

Termínio Previsto

07/05/2025

46 dias

A executar
(70,43%)

Data da Medição

25/03/2025

Das corridas desde
o início da obra

Prazo para
conclusão da obra

43 dias

R\$ 364.179,77

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)			VALORES C/ BDI (R\$)			PERCENTUAIS (%)		
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIOREMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIOREMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIOREMENTE
03.07.01.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 61,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,68	0,00%
03.07.01.18	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	4,00			4,00	R\$ 598,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,92	0,00%
03.07.01.19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00			8,00	R\$ 464,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 464,16	0,00%
03.07.01.20	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS DE LED 20W CADA	UN	37,00			37,00	R\$ 5.194,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.194,80	0,00%
03.07.01.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00			4,00	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,00	0,00%
03.07.01.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 125,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,24	0,00%
03.07.01.23	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 89,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,82	0,00%
03.07.01.24	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3,00	R\$ 163,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,80	0,00%
03.07.01.25	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00			7,00	R\$ 324,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,80	0,00%
03.07.01.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00			11,00	R\$ 428,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,34	0,00%
03.07.01.27	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00	R\$ 93,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,54	0,00%
03.07.01.28	PONTO PARA EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO MONOFÁSICO 2P+T 1ARSTOP	UN	4,00			4,00	R\$ 175,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,40	0,00%
03.07.01.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	246,40			246,40	R\$ 5.300,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.300,06	0,00%
03.07.01.30	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	11,00			11,00	R\$ 273,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,90	0,00%
03.07.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 7.748,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.748,51	0,00%
03.07.02.01	MOVIMENTO DE TERRA	M3	0,14			0,14	R\$ 13,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,87	0,00%
03.07.02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA PASSAGENS DE TUBULAÇÃO.	M3	0,14			0,14	R\$ 4,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,30	0,00%
03.07.02.01.02	REATERRO APLIADO SEM EMPRESTIMO.						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.02.02	APARELHO	UN	2,00			2,00	R\$ 85,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,86	0,00%
03.07.02.02.01	CHUVEIRO COM HASTE, 25MM X 3/4"	UN	2,00			2,00	R\$ 1.228,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,20	0,00%
03.07.02.02.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL, 1/2 X 40CM, 1/2"	UN	2,00			2,00	R\$ 108,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,52	0,00%
03.07.02.02.03	ASSENTO PLÁSTICO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO.	UN	2,00			2,00	R\$ 2.430,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.430,32	0,00%
03.07.02.02.04	CUJA DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA PARA LAVATÓRIO, COM VALVULA SIFONADO, TORNEIRA DE MESA E ENGATE FLEXÍVEL.	UN	4,00			4,00	R\$ 649,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 649,46	0,00%
03.07.02.02.05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 25MM - 3/4"	UN	2,00			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.02.03	METAS	UN	5,00			5,00	R\$ 267,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,35	0,00%
03.07.02.03.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT, 3/4"	UN	2,00			2,00	R\$ 241,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,95	0,00%
03.07.02.03.02	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA, 3/4"	UN	2,00			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.02.04	PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	2,00			2,00	R\$ 79,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,74	0,00%
03.07.02.04.01	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA, 25 MM - 1/2"	UN	2,00			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%



V.D.E.S CAMPOS/LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18
Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Local da obra: Sede Do Município

Contrato: CNPJ 13.958.944/0001-18

Med. 01
Boletim de medição atual

Valor do contrato R\$ 517.046,91

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 01

Concorrência - 003.2024
RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI
de 07/02/2025 até 25/03/2025

07/02/2025
47 dias
Dias corridos desde a medição anterior

Termino Previsto

07/05/2025

25/03/2025

Prazo para conclusão da obra

46 dias

43 dias

03.07.02.05
03.07.02.05.01
03.07.02.05.02
03.07.02.05.03
03.07.02.05.04
03.07.02.05.05
03.07.02.05.06
03.07.02.05.07
03.07.02.05.08
03.07.02.05.09
03.07.02.05.10
03.07.02.05.11
03.07.02.05.12
03.07.02.06
03.07.02.06.01
03.07.02.06.02
03.07.02.06.03
03.07.02.07
03.07.02.07.01
03.07.02.07.02
03.07.03
03.07.03.01
03.07.03.01.01
03.07.03.01.02
03.07.03.02
03.07.03.03
03.07.03.03.01
03.07.03.03.02
03.07.03.03.03
03.07.03.03.04
03.07.03.03.05
03.07.03.03.06
03.07.03.03.07
03.07.03.03.08
03.07.03.03.09
03.07.03.03.10
03.07.03.03.11
03.07.03.03.12
03.07.03.03.13
03.07.03.03.14

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)			VALORES C/ BDI (R\$)			PERCENTUAIS (%)				
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR
03.07.02.05	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						R\$	-			R\$	-	
03.07.02.05.01	ADAPT SOLD CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO. 25 MM -3/4"	UN	10,00			10,00	R\$	74,20	R\$	-	R\$	74,20	
03.07.02.05.02	JOELHO 90° SOLDÁVEL. 25 MM	UN	22,00			22,00	R\$	214,06	R\$	-	R\$	214,06	
03.07.02.05.03	JOELHO 90° SOLDÁVEL. 32 MM	UN	1,00			1,00	R\$	13,56	R\$	-	R\$	13,56	
03.07.02.05.04	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL. 32 MM - 25 MM	UN	2,00			2,00	R\$	33,28	R\$	-	R\$	33,28	
03.07.02.05.05	TUBO. PVC SOLDÁVEL. 25 MM	M	35,80			35,80	R\$	939,03	R\$	-	R\$	939,03	
03.07.02.05.06	TUBO. PVC SOLDÁVEL. 32 MM	M	7,50			7,50	R\$	269,48	R\$	-	R\$	269,48	
03.07.02.05.07	TUBO. PVC SOLDÁVEL. 40 MM	M	17,10			17,10	R\$	306,60	R\$	-	R\$	306,60	
03.07.02.05.08	TÉ 90 SOLDÁVEL. 25 MM	UN	4,00			4,00	R\$	58,84	R\$	-	R\$	58,84	
03.07.02.05.09	TÉ 90 SOLDÁVEL. 32 MM	UN	1,00			1,00	R\$	20,45	R\$	-	R\$	20,45	
03.07.02.05.10	TÉ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL. 40 MM - 32 MM	UN	1,00			1,00	R\$	19,79	R\$	-	R\$	19,79	
03.07.02.05.11	TÉ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL. 40 MM - 25 MM	UN	2,00			2,00	R\$	65,72	R\$	-	R\$	65,72	
03.07.02.05.12	BUCHA DE REDUÇÃO. 40 MM - 25 MM	UN	1,00			1,00	R\$	9,06	R\$	-	R\$	9,06	
03.07.02.06	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO						R\$	-			R\$	-	
03.07.02.06.01	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. 25 MM - 3/4"	UN	2,00			2,00	R\$	36,02	R\$	-	R\$	36,02	
03.07.02.06.02	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. 25 MM - 1/2"	UN	5,00			5,00	R\$	72,20	R\$	-	R\$	72,20	
03.07.02.06.03	TÉ RED.90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL. 25 MM -1/2"	UN	1,00			1,00	R\$	22,61	R\$	-	R\$	22,61	
03.07.02.07	QUEBRA E FECHAMENTO DE ALVENARIA						R\$	-			R\$	-	
03.07.02.07.01	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA.	M	18,12			18,12	R\$	160,00	R\$	-	R\$	160,00	
03.07.02.07.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	M	18,12			18,12	R\$	324,53	R\$	-	R\$	324,53	
03.07.03	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$	21.712,00	R\$	-	R\$	19.459,19	
03.07.03.01	CAIXAS DE PASSAGEM						R\$	-			R\$	-	
03.07.03.01.01	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA. DN 40 CM	UN	1,00			1,00	R\$	204,27	R\$	-	R\$	204,27	
03.07.03.01.02	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA. DN 60 CM	UN	2,00			2,00	R\$	158,30	R\$	-	R\$	158,30	
03.07.03.02	ACESSÓRIOS						R\$	-			R\$	-	
03.07.03.02.01	CAIXA SIFONADA. 100X150X50	UN	7,00			7,00	R\$	328,02	R\$	-	R\$	328,02	
03.07.03.03	PVC ESGOTO						R\$	-			R\$	-	
03.07.03.03.01	ANEL DE BORRACHA. 100MM - 4"	UN	5,00			5,00	R\$	38,20	R\$	-	R\$	38,20	
03.07.03.03.02	ANEL DE BORRACHA. 50MM - 2"	UN	17,00			17,00	R\$	95,88	R\$	-	R\$	95,88	
03.07.03.03.03	CURVA 90 CURTA. 100 MM	UN	2,00			2,00	R\$	89,42	R\$	-	R\$	89,42	
03.07.03.03.04	CURVA 90 CURTA. 40 MM	UN	6,00			6,00	R\$	82,62	R\$	-	R\$	82,62	
03.07.03.03.05	CURVA 45 LONGA. 100 MM	UN	1,00			1,00	R\$	57,34	R\$	-	R\$	57,34	
03.07.03.03.06	JOELHO 45. 40 MM	UN	3,00			3,00	R\$	34,05	R\$	-	R\$	34,05	
03.07.03.03.07	JOELHO 45. 50 MM	UN	6,00			6,00	R\$	107,46	R\$	-	R\$	107,46	
03.07.03.03.08	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO. 40 MM - 1,1/2"	UN	4,00			4,00	R\$	221,84	R\$	-	R\$	221,84	
03.07.03.03.09	JUNÇÃO SIMPLES. 100 MM - 50 MM	UN	21,00			21,00	R\$	841,32	R\$	-	R\$	841,32	
03.07.03.03.10	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 100 MM - 4"	M	15,00			15,00	R\$	137,43	R\$	-	R\$	137,43	
03.07.03.03.11	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 40 MM	M	6,10			6,10	R\$	67,59	R\$	-	R\$	67,59	
03.07.03.03.12	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 50 MM - 2"	M	25,20			25,20	R\$	704,34	R\$	-	R\$	704,34	
03.07.03.03.13	ANEL DE VEDAÇÃO. PVC FLEXIVEL. 100 MM. PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO. 100 MM	UN	2,00			2,00	R\$	60,24	R\$	-	R\$	60,24	
03.07.03.03.14	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS. 1,6 X 4,4 X H=1,8 M. VOLUME ÚTIL= 9856 L (PARA 68 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020.	UN	1,00			1,00	R\$	11.255,28	R\$	-	R\$	11.255,28	



V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

CNPJ 13.958.944/0001-18

Modalidade

Concorrência - 003.2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 01

Início da obra 07/02/2025

Término Previsto 07/05/2025

Data da Medição 25/03/2025

Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Boletim de medição atual

MED. 01

de 07/02/2025 até 25/03/2025

46 dias

43 dias

Local da obra: Sede Do Município

Valor do contrato

Executado na MED. 01 (23,57%)

Acumulado até a MED. 01 (29,57%)

46 dias

364.179,77

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)			VALORES C/ E.D.T (R\$)			PERCENTUAIS (%)		
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO NA MED. 01
03.07.03.03.15	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 11,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES),..	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 7.132,82	R\$ -	R\$ 7.132,82	R\$ -	100,00%
03.07.03.04.01	QUEBRA E FECHAMENTO DE ALVENARIA	M	3,60	3,60	3,60	3,60	R\$ 31,79	R\$ -	R\$ 31,79	R\$ -	0,00%
03.07.03.04.02	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA.	M	3,60	3,60	3,60	3,60	R\$ 64,48	R\$ -	R\$ 64,48	R\$ -	0,00%
03.07.04	INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO SANITÁRIAS						R\$ 1.486,14	R\$ -	R\$ 1.486,14	R\$ -	0,00%
03.07.04.01	PVC ESGOTO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.01	ANEL DE BORRACHA, 100MM - 4"	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 15,28	R\$ -	R\$ 15,28	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.02	ANEL DE BORRACHA, 50MM - 2"	UN	31,00	31,00	31,00	31,00	R\$ 174,84	R\$ -	R\$ 174,84	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.03	JOELHO 90, 50 MM	UN	13,00	13,00	13,00	13,00	R\$ 224,25	R\$ -	R\$ 224,25	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.04	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 20,86	R\$ -	R\$ 20,86	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.05	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 50 MM - 2"	M	16,90	16,90	16,90	16,90	R\$ 472,36	R\$ -	R\$ 472,36	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.06	TÊ SANITÁRIO, 50 MM - 50 MM	UN	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 218,00	R\$ -	R\$ 218,00	R\$ -	0,00%
03.07.04.01.07	TÊ SANITÁRIO, 100 MM - 50 MM	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 89,40	R\$ -	R\$ 89,40	R\$ -	0,00%
03.07.04.02	QUEBRA E FECHAMENTO DE ALVENARIA	M	10,14	10,14	10,14	10,14	R\$ 89,54	R\$ -	R\$ 89,54	R\$ -	0,00%
03.07.04.02.01	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA.	M	10,14	10,14	10,14	10,14	R\$ 181,61	R\$ -	R\$ 181,61	R\$ -	0,00%
03.07.04.02.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA.	M	10,14	10,14	10,14	10,14	R\$ 18,835,28	R\$ -	R\$ 18,835,28	R\$ -	0,00%
03.07.05	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.05.01	PVC ACESSÓRIOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.05.01.01	ANEL DE BORRACHA, 100MM - 4"	UN	38,00	38,00	38,00	38,00	R\$ 290,32	R\$ -	R\$ 290,32	R\$ -	0,00%
03.07.05.01.02	JOELHO 45, 100 MM	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 120,54	R\$ -	R\$ 120,54	R\$ -	0,00%
03.07.05.01.03	JOELHO 90, 100 MM	UN	31,00	31,00	31,00	31,00	R\$ 1.217,06	R\$ -	R\$ 1.217,06	R\$ -	0,00%
03.07.05.01.04	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, 100 MM - 4"	M	64,80	64,80	64,80	64,80	R\$ 1.974,46	R\$ -	R\$ 1.974,46	R\$ -	0,00%
03.07.05.01.05	TÊ SANITÁRIO, 100 MM - 100 MM	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 100,12	R\$ -	R\$ 100,12	R\$ -	0,00%
03.07.05.02	CALHA METÁLICA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.07.05.02.01	CALHA METÁLICA, DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	78,00	78,00	78,00	78,00	R\$ 15.132,78	R\$ -	R\$ 15.132,78	R\$ -	0,00%
03.08	COBERTURA						R\$ 32.451,04	R\$ -	R\$ 32.451,04	R\$ -	0,00%
03.08.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS	M2	254,00	254,00	254,00	254,00	R\$ 17.264,38	R\$ -	R\$ 17.264,38	R\$ -	0,00%
03.08.02	IMUNIZAÇÃO DE TELHADO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	254,00	254,00	254,00	254,00	R\$ 3.690,62	R\$ -	R\$ 3.690,62	R\$ -	0,00%
03.08.03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL	M2	254,00	254,00	254,00	254,00	R\$ 11.496,04	R\$ -	R\$ 11.496,04	R\$ -	0,00%
03.09	REVESTIMENTOS						R\$ 68.243,15	R\$ -	R\$ 68.243,15	R\$ -	0,00%
03.09.01	CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E=0,5 CM - APLICADO NAS PAREDES E BALDRAME	M2	948,86	948,86	948,86	948,86	R\$ 5.759,58	R\$ -	R\$ 5.759,58	R\$ -	0,00%
03.09.02	REBOCO EM ARGAMASSA MASA ÚNICA 1:2:8, ESP= 2CM - APLICADO NAS PAREDES E BALDRAME	M2	948,86	948,86	948,86	948,86	R\$ 41.987,06	R\$ -	R\$ 41.987,06	R\$ -	0,00%
03.09.03	REVESTIMENTO CERÂMICO, 30 X 40 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M²	161,83	161,83	161,83	161,83	R\$ 15.589,08	R\$ -	R\$ 15.589,08	R\$ -	0,00%
03.09.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA 10X10 CM - CORES CONFORME O PROJETO	M²	43,48	43,48	43,48	43,48	R\$ 4.907,43	R\$ -	R\$ 4.907,43	R\$ -	0,00%
03.10	ESQUADRIAS						R\$ 22.949,63	R\$ -	R\$ 22.949,63	R\$ -	0,00%
03.10.01	PORTA COM GUARNIÇÃO DE MADEIRA, VISOR DE VIDRO, E PLACA INFERIOR METÁLICA E BARRA DE APOIO PNE	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 2.625,12	R\$ -	R\$ 2.625,12	R\$ -	0,00%
03.10.02	PORTA COM GUARNIÇÃO DE MADEIRA, VISOR DE VIDRO, E PLACA INFERIOR METÁLICA E BARRA DE APOIO PNE	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.471,81	R\$ -	R\$ 2.471,81	R\$ -	0,00%
03.10.03	PORTA INTERNA, DE ABRIR, EM ALUMÍNIO PARA CABINE DE BANHEIRO, (60X180CM), COMPLETA	M2	4,32	4,32	4,32	4,32	R\$ 2.956,65	R\$ -	R\$ 2.956,65	R\$ -	0,00%
03.10.04	PORTA DE FERRO GALVANIZADO, DE ABRIR, COM GUARNIÇÕES, COMPLETA	M²	3,36	3,36	3,36	3,36	R\$ 1.746,63	R\$ -	R\$ 1.746,63	R\$ -	0,00%



V DE S CAMPOS/LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODÓVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Obras: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Local da obra: Sede Do Município

Contrato

CNPJ 13.958.944/0001-18

Baseim de medição atual

Valor do contrato

Modalidade

Entorpeco

Período da medição

Executado na MED. 01 (29,57%)

Concorrência - 003.2024

RUA EDVALDO BERNARDES, N° 10, CENTRO - PAULISTANA PI

de 07/02/2025 até 25/03/2025

Dias corridos desde a medição anterior

Início da obra

07/02/2025

47 dias

Acumulado até a MED. 01 (29,57%)

Termino Previsto

07/05/2025

46 dias

A executar (70,43%)

Data da Medição

25/03/2025

Prazo para conclusão da obra

43 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA N° 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)			VALORES C/ BDI (R\$)			PERCENTUAIS (%)				
			TOTAL PREVISITO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISITO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR
03.10.05	PORTÃO EM GRADIL VAZADO DE CHAPA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA CHATA DE 3CM X 1/4", COM GUARNIÇÕES	M2	1,68			1,68	R\$ 936,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 936,63	0,00%	0,00%	100,00%
03.10.06	JANELA DE ALUMÍNIO COR BRANCA DE CORRER COM 2 FOLHAS, COM VIDROS LISO INCOLOR TRANSPARENTE 4MM, BATENTE E FERRAGENS	M2	29,80			29,80	R\$ 10.716,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.716,77	0,00%	0,00%	100,00%
03.10.07	JANELA EM FERRO PINTADA NA COR BRANCA, TIPO BASCULANTE COM VIDRO CANELADO TRANSPARENTE	M²	1,44			1,44	R\$ 1.496,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.496,02	0,00%	0,00%	100,00%
03.11	FORRO												
03.11.01	FORRO EM PVC	M2	206,01			206,01	R\$ 19.002,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.002,36	0,00%	0,00%	100,00%
03.12	PINTURA												
03.12.01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	6,72			6,72	R\$ 123,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,85	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.02	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	10,80			10,80	R\$ 621,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,76	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.03	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO	M2	215,88			215,88	R\$ 1.055,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.055,65	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.04	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO SOBRE PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO	M2	153,44			153,44	R\$ 750,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,32	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.05	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO SOBRE LAJES, UMA DEMÃO	M2	34,00			34,00	R\$ 202,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,98	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.06	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	215,88			215,88	R\$ 2.717,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,93	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.07	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	153,44			153,44	R\$ 1.931,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,81	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.08	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM LAJES, DUAS DEMÃOS	M2	34,00			34,00	R\$ 1.199,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.199,52	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, EM DUAS DEMÃOS	M2	215,88			215,88	R\$ 3.026,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.026,64	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM LAJE, DUAS DEMÃOS	M2	34,00			34,00	R\$ 567,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,46	0,00%	0,00%	100,00%
03.12.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, EM DUAS DEMÃOS	M2	153,44			153,44	R\$ 2.151,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,23	0,00%	0,00%	100,00%
03.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
03.13.01	BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESP=2,0CM	M²	6,44			6,44	R\$ 4.361,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.361,49	0,00%	0,00%	100,00%
03.13.02	DIVISÓRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO, ESP=2,0CM, POLIDO EM AMBOS OS LADOS	M2	14,52			14,52	R\$ 5.993,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.993,13	0,00%	0,00%	100,00%
03.13.03	RUFO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 5,0 CM	M	13,40			13,40	R\$ 520,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,99	0,00%	0,00%	100,00%
03.13.04	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 3,0 CM	M	64,96			64,96	R\$ 1.204,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.204,45	0,00%	0,00%	100,00%
03.13.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS	M2	51,04			51,04	R\$ 2.238,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238,10	0,00%	0,00%	100,00%
03.13.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS E = 3MM E 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	34,00			34,00	R\$ 12.161,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.161,12	0,00%	0,00%	100,00%
03.13.07	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA A MANTA ASFÁLTICA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM	M2	34,00			34,00	R\$ 1.671,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.671,10	0,00%	0,00%	100,00%
03.14	SERVIÇOS FINAIS												
03.14.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	231,74			231,74	R\$ 986,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 986,36	0,00%	0,00%	100,00%
03.14.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO E TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M²	M²	0,72			0,72	R\$ 31,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,76	0,00%	0,00%	100,00%
TOTALS DA MEDIÇÃO			R\$ 517.046,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.867,14	R\$ 364.179,77	0,00%	29,57%	70,43%			



V DE S CAMPOS
LOCACÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Obras: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO INDUSTRIAL DE
GRANULADOS E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Local de obra: Sede Do Município

Contrato:

CNPJ 13.958.944/0001-18

Boletim de medição atual

Valor do
contrato

Modalidade

Engeceiro

Período da
Medição

Executado na
MED. 01 (29,57%)

Concorrência - 003.2024

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

de 07/02/2025 até 25/03/2025

Dias corridos desde
a medição anterior

Início da obra

07/02/2025

47 dias

Acumulado até a
MED. 01 (29,57%)

Término Previsto

07/05/2025

Dias corridos desde
o início da obra

A executar
(70,43%)

Data da Medição

25/03/2025

Prazo para
conclusão da obra

43 dias

Valor do contrato

R\$ 517.046,91

R\$

152.867,14

ITEM	UNID	QUANTIDADES (UND)				VALORES C/ BDI (R\$)				PERCENTUAIS (%)			
		TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIOREMTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIOREMTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIOREMTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	SALDO A EXECUTAR

CREA:

Documento assinado digitalmente
MÁRIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA CAMPO:
Data: 25/03/2025 18:00:41 -0300
Verifique em <https://validar.rh.gov.br>



CHARLES DA
Assinado de forma
digital por CHARLES
DA SILVA
DOURADO:00998359
327
Dados: 2025.03.25
16:55:33 -03'00'



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA


GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA - CC 004.2024 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA

Eng Fiscal - Charles da Silva Dourado – CREA 191002101-6

25/03/2025





GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO





GABINETE DO PREFEITO





GABINETE DO PREFEITO





GABINETE DO PREFEITO





GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO

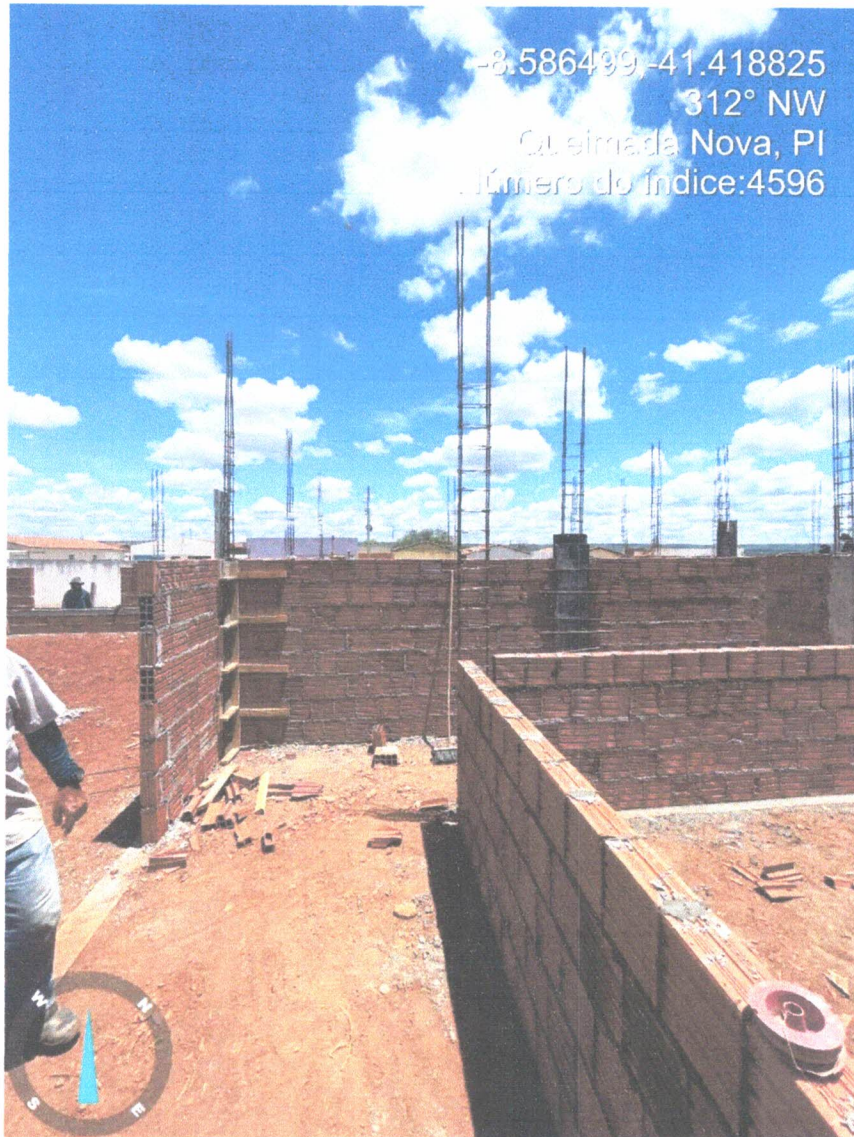




PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO

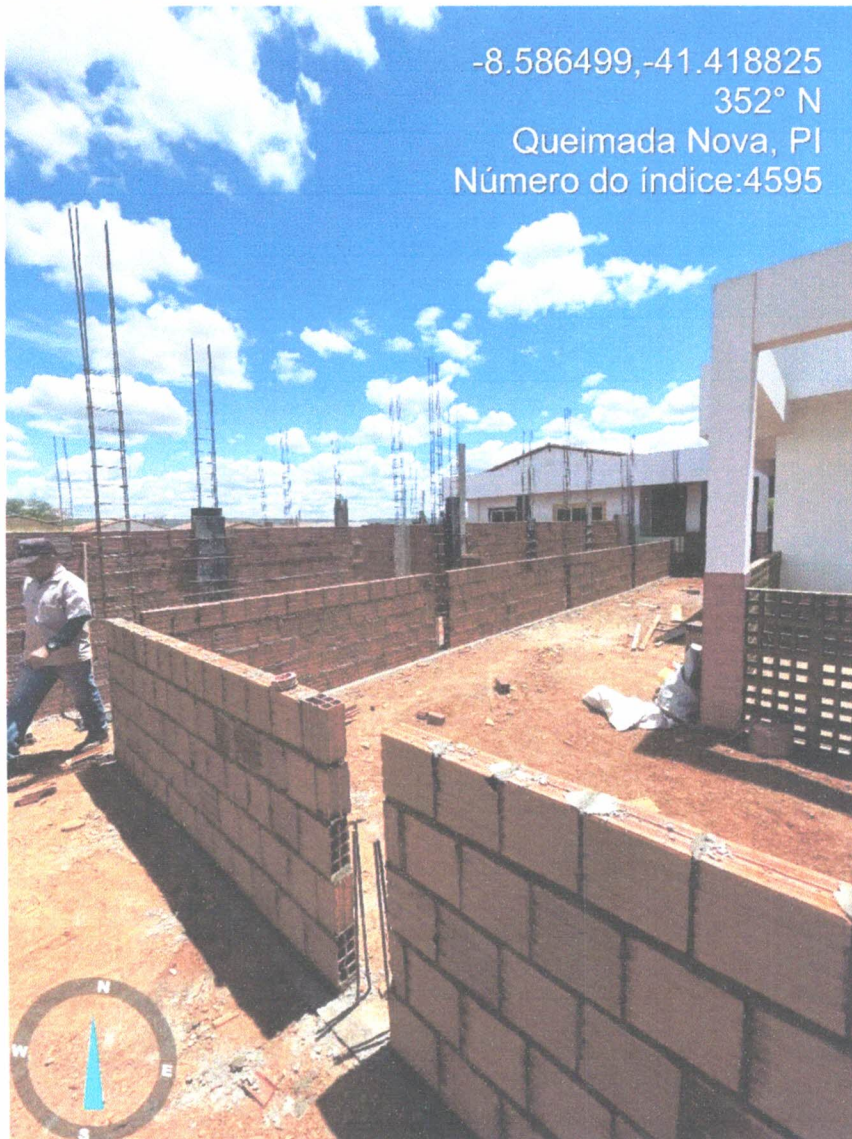




GABINETE DO PREFEITO

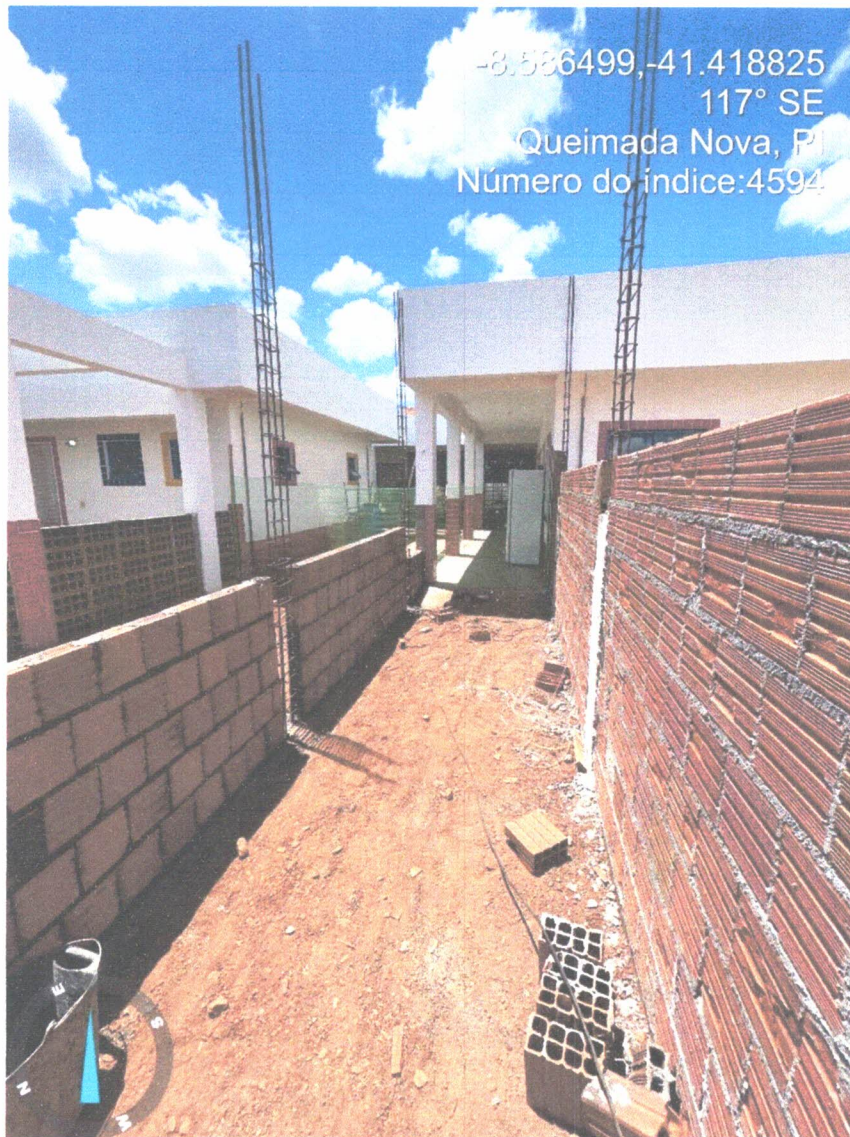




GABINETE DO PREFEITO

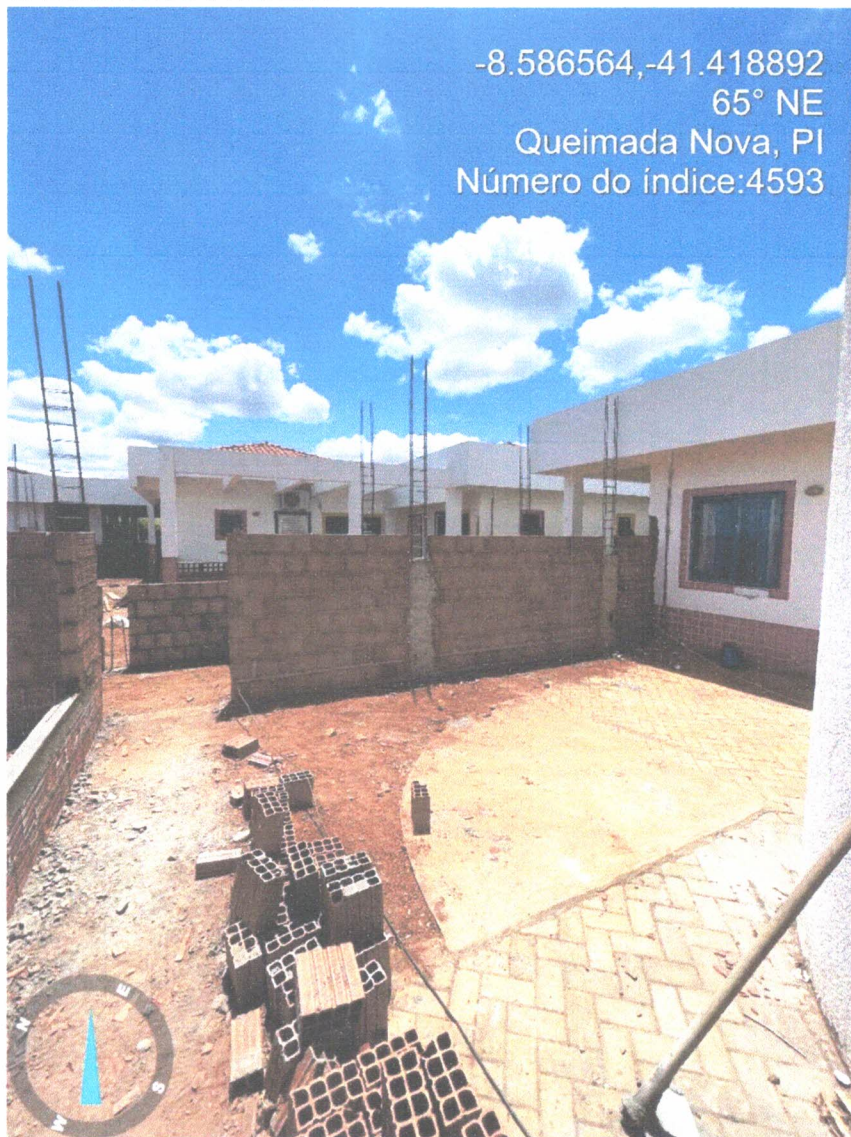




GABINETE DO PREFEITO

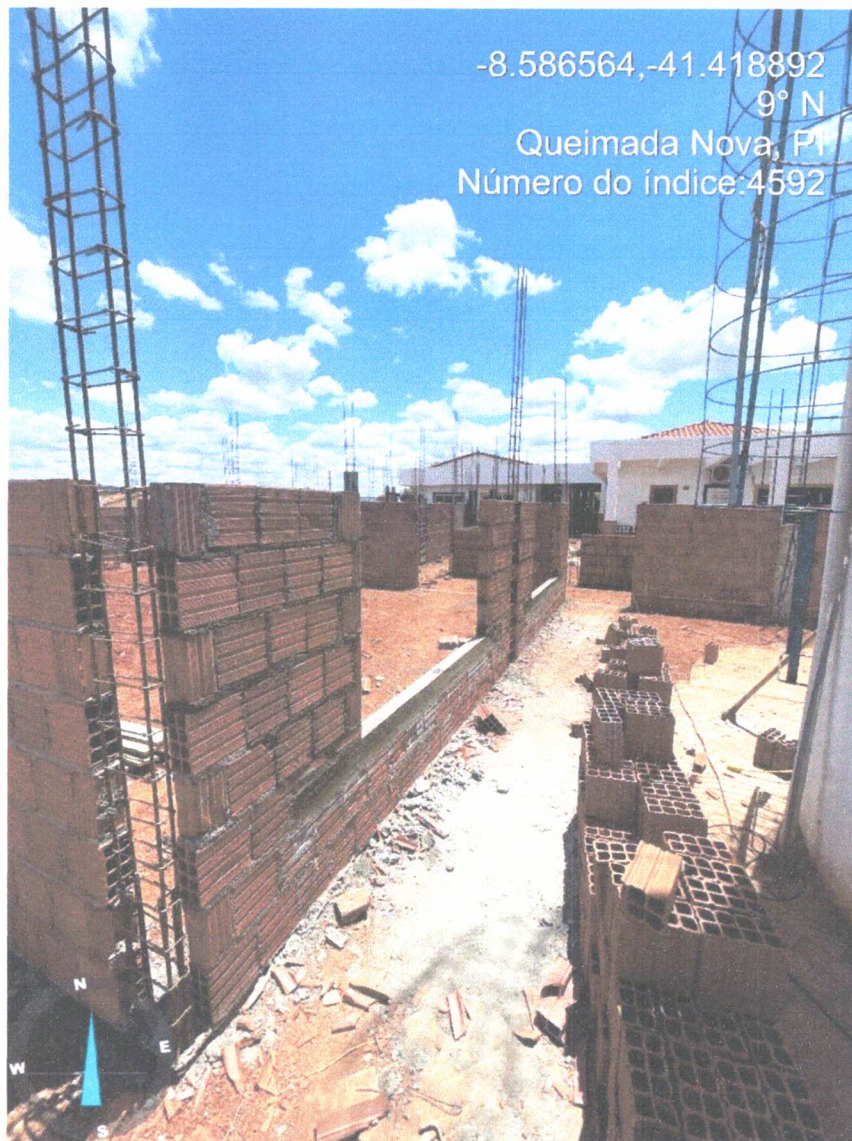



GABINETE DO PREFEITO

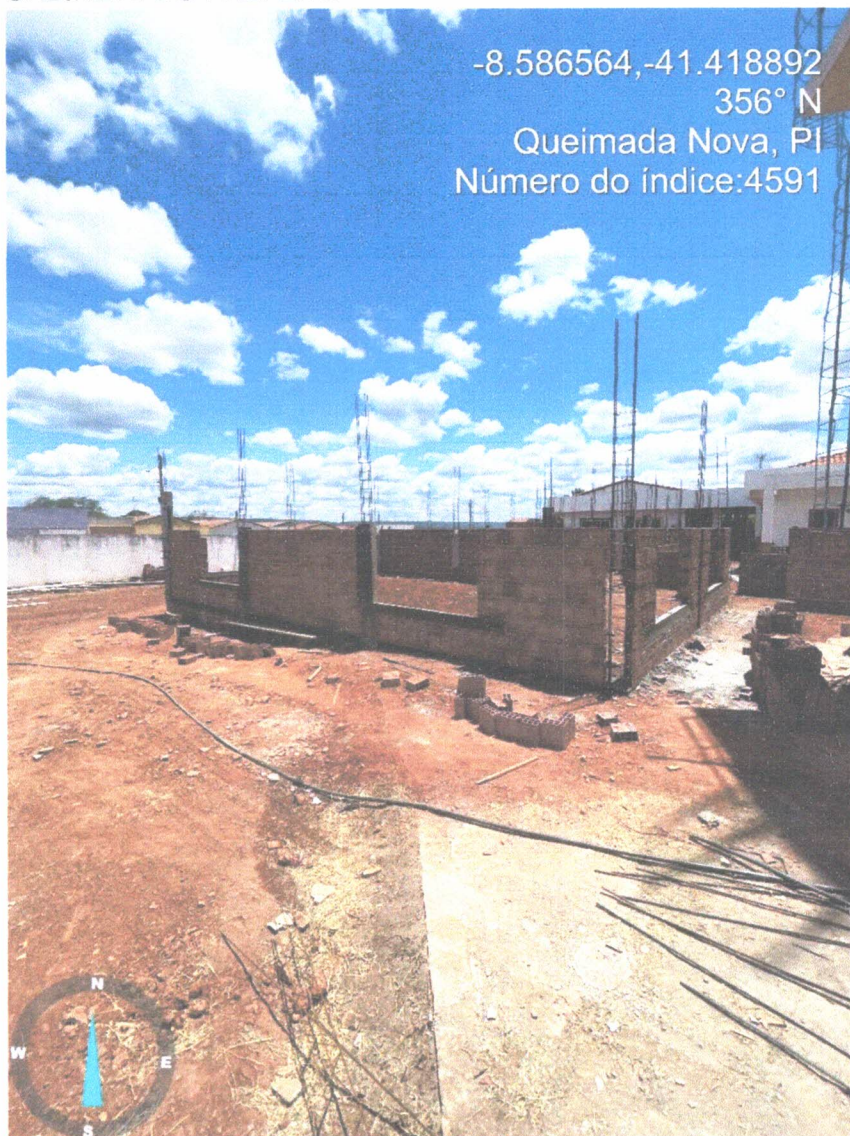




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






GABINETE DO PREFEITO

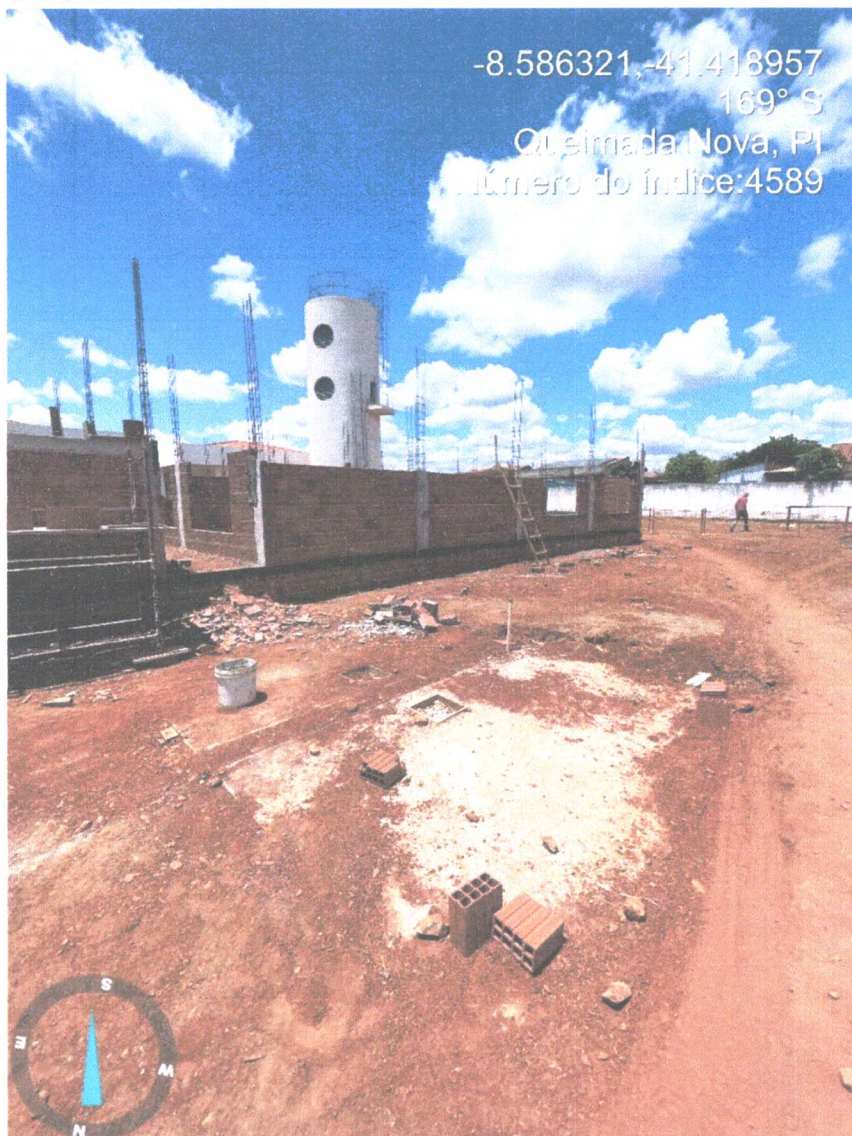



GABINETE DO PREFEITO

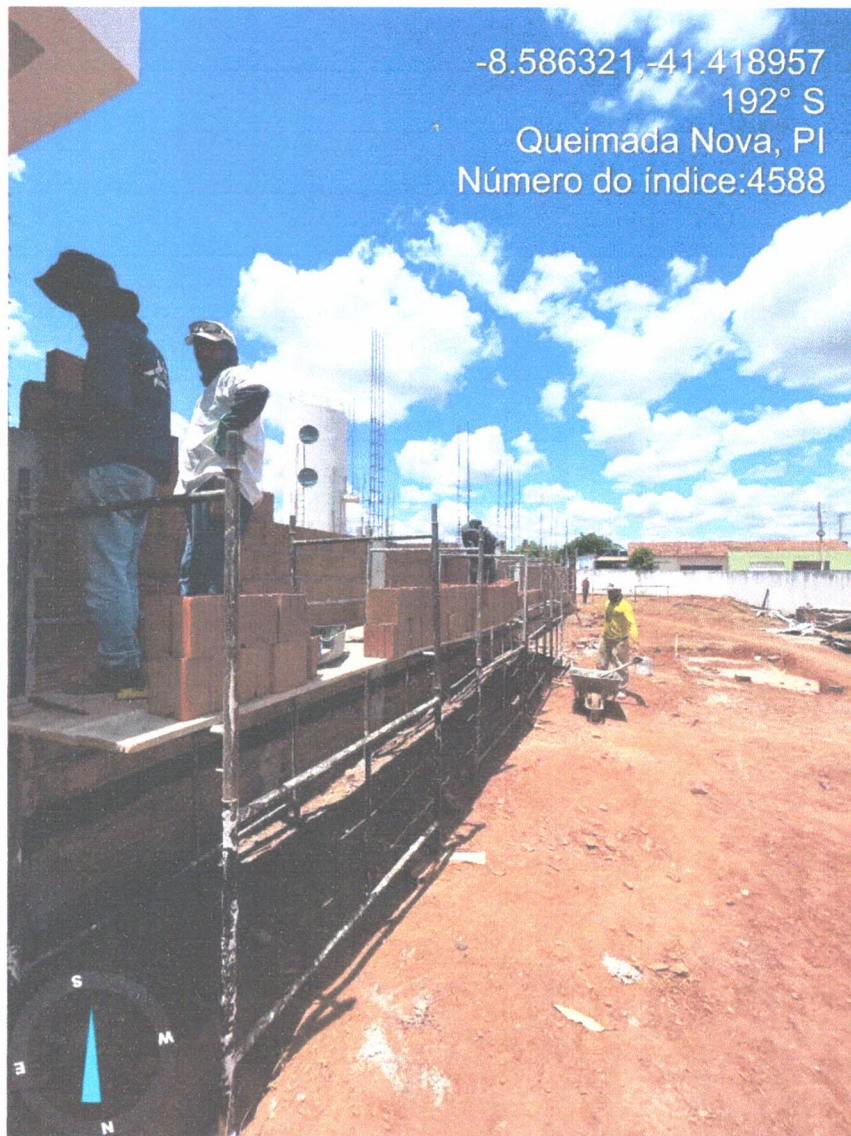



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA


GABINETE DO PREFEITO



-8.586321,-41.418957
175° S
Queimada Nova, PI
Número do índice: 4587



GABINETE DO PREFEITO

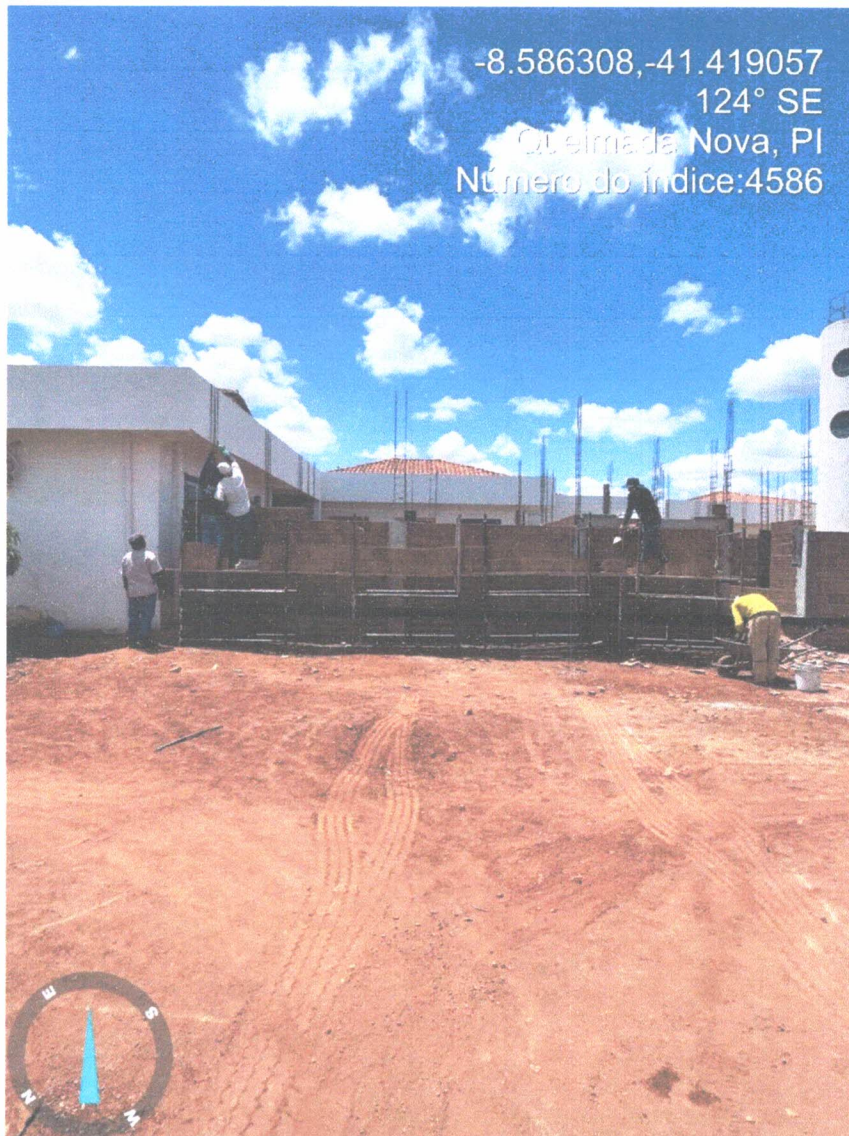



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO

-8.586308,-41.419057
109° E
Queimada Nova, PI
Número do índice:4584

**AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA
LOCALIZADA NA ZONA URBANA
DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI**

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 517.046,91 COMUNIDADE: SEDE (ZONA URBANA) MUNICÍPIO: QUEIMADA NOVA - (PI)	AGENTES PARTICIPANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0032004 INÍCIO DA OBRA: 07/02/2025 TÉRMINO DA OBRA: 07/05/2025	NOME DA INSTITUIÇÃO OU EMPRESA PARTICIPANTE: V DE S CAMPOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. RESPONSÁVEL TÉCNICO: SHEILA DA SILVA DOURADO LIMA Nº REGISTRO P1352489 RRT: 15350256
--	--	---

 **PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA**
CONSTRUINDO FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

 **PDE FUNDEB**
Programa de Desenvolvimento da Educação Básica

 **GOVERNO FEDERAL BRASIL**
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

FAFA
