



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR MERGELINA DOURADO GUERRA
SITUAÇÃO ATUAL:	Finalizada
DATA DE INÍCIO	12/07/2025
TÉRMINO	12/07/2026
EMPRESA CONTRATADA:	AXIS INFRA LTDA
CONTRATO ADMINISTRATIVO	Nº008/2025
PORCENTUAL CONCLUÍDO	93,00%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA DA UNIDADE ESCOLAR MERGELINA DOURADO GERRA



CIDADE: CURIMATÁ - PI



EMPRESA CONTRATADA: AXIS INFRA LTDA


PERÍODO: 01/10 - 31/10/2025



RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS

SERVIÇOS: CONCLUSÃO GERAL DE OBRA - EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM, PINTURA GERAL DA OBRA, LIMPEZA DA OBRA.

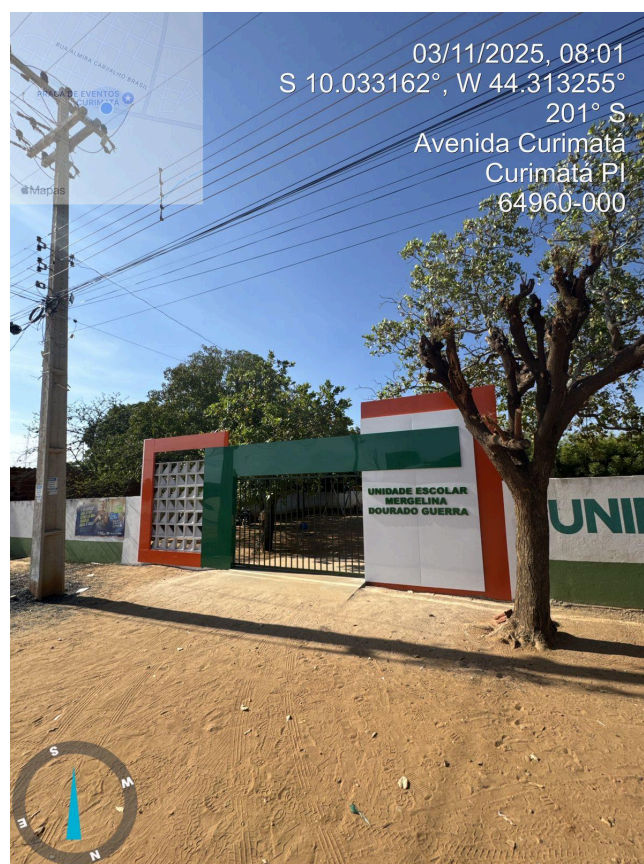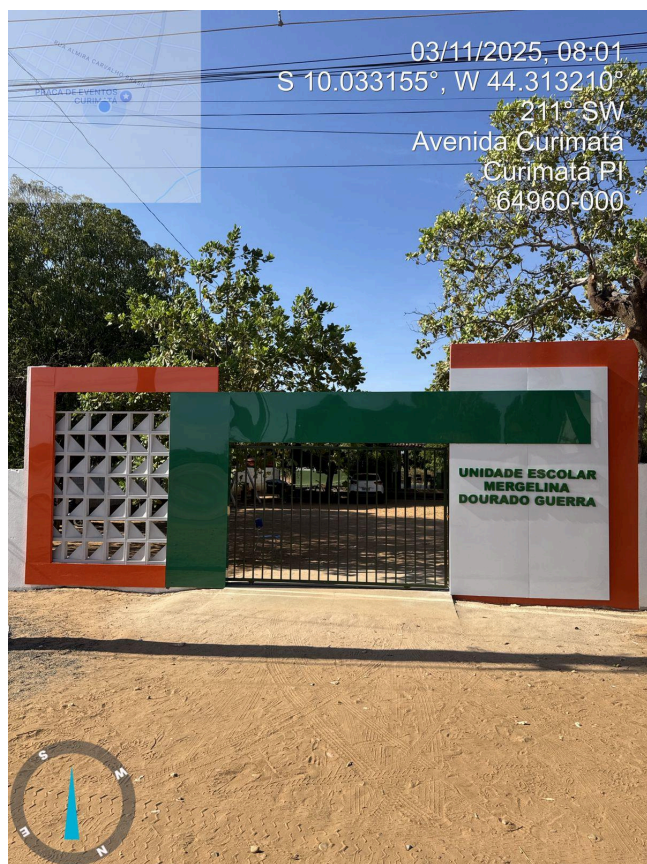

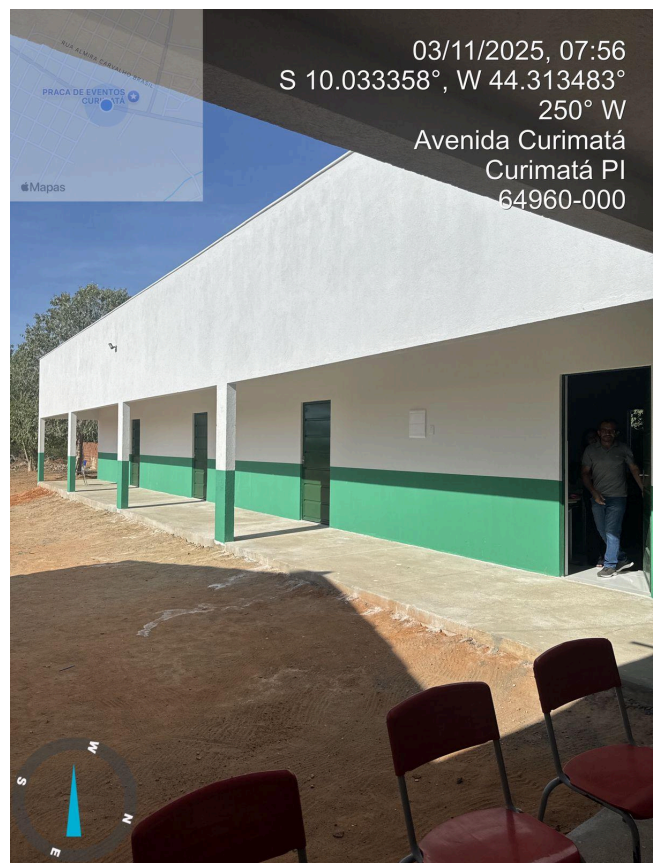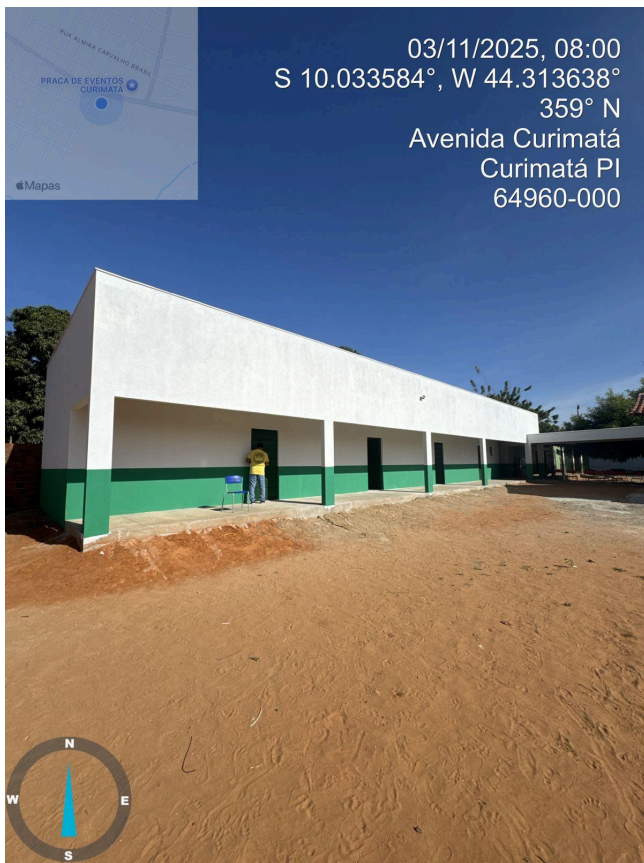

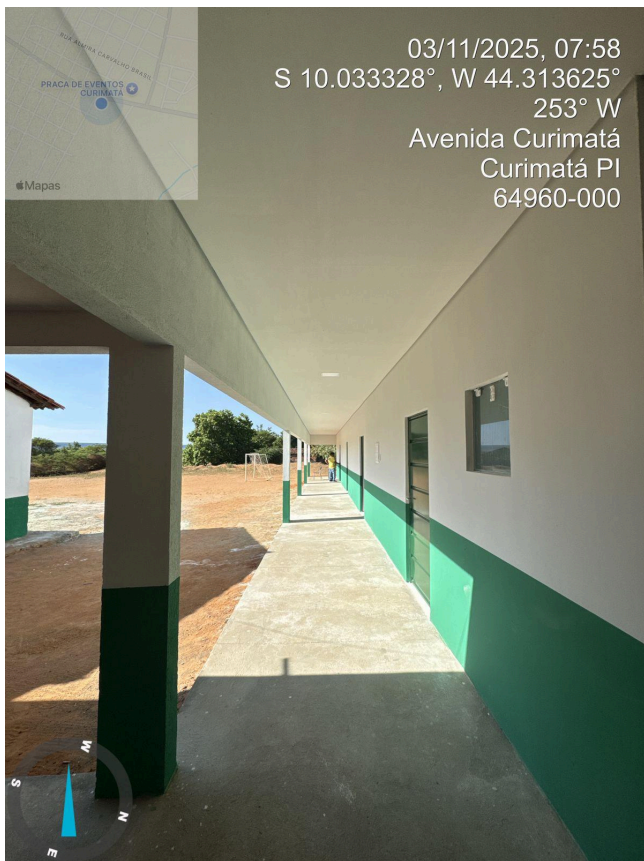

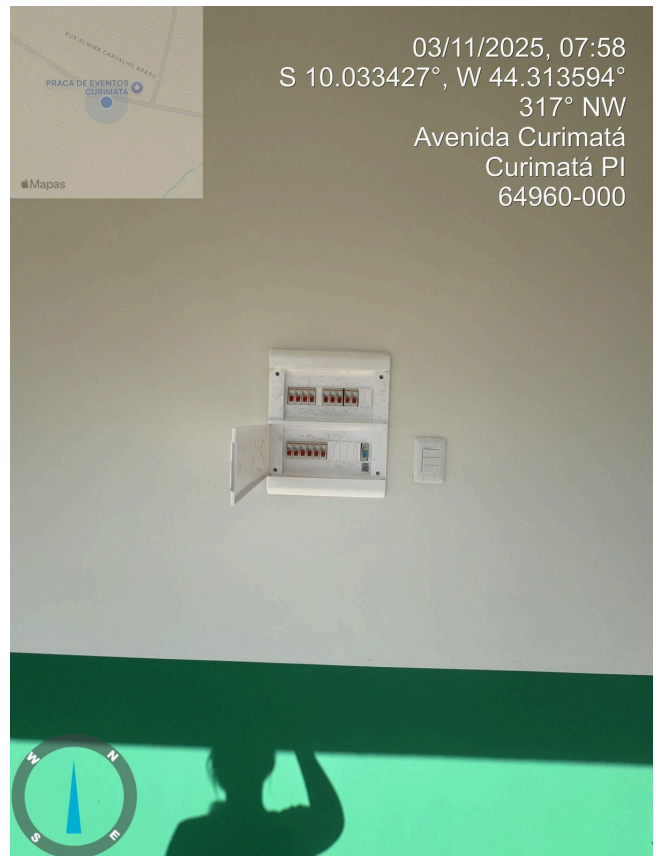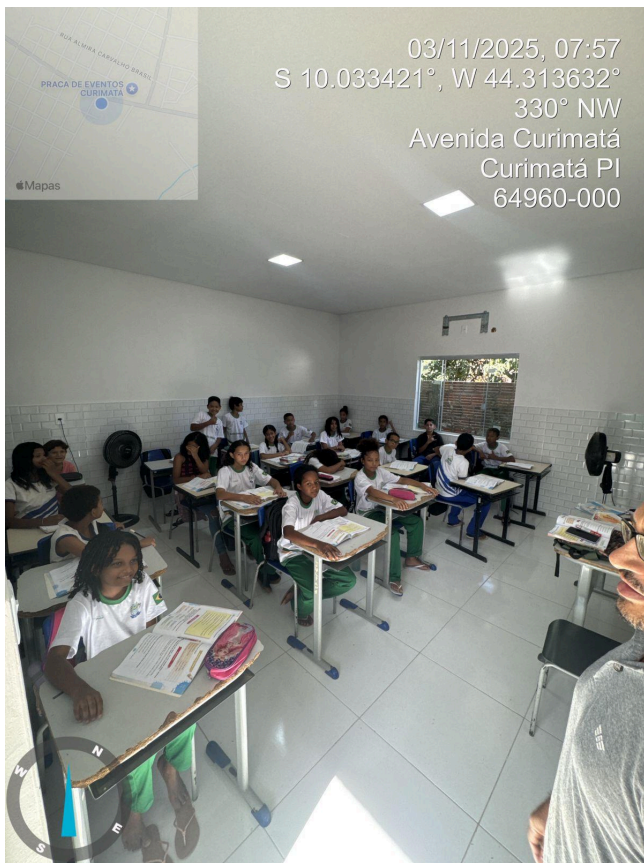

Luri Araújo
Guimarães

Assinado de forma digital
por Luri Araújo Guimarães
Dados: 2025.11.06
17:13:09-03'00"

ENGENHEIRA CIVIL DA EMPRESA

gov.br

Documento assinado digitalmente
ADELMO FIGUEREDO DA SILVA
Data: 06/11/2025 14:59:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
