

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

<b>OBJETO:</b>	Construção da Unidade Escolar Alexandrina Brito no Povoado Santo Antônio, zona rural de Júlio Borges/PI
<b>SITUAÇÃO ATUAL:</b>	Em andamento
<b>DATA DE INÍCIO:</b>	29/12/2025
<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b>	29/12/2026
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b>	WR engenharia e locações de veículos LTDA (CNPJ 36.666.319/0001-06)
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 380/2025
<b>PERCENTUAL CONCLUÍDO:</b>	17,20%



Foto 1: Levantamento de alvenaria de vedação



Foto 2: Levantamento de alvenaria de vedação, aterro e apiloamento

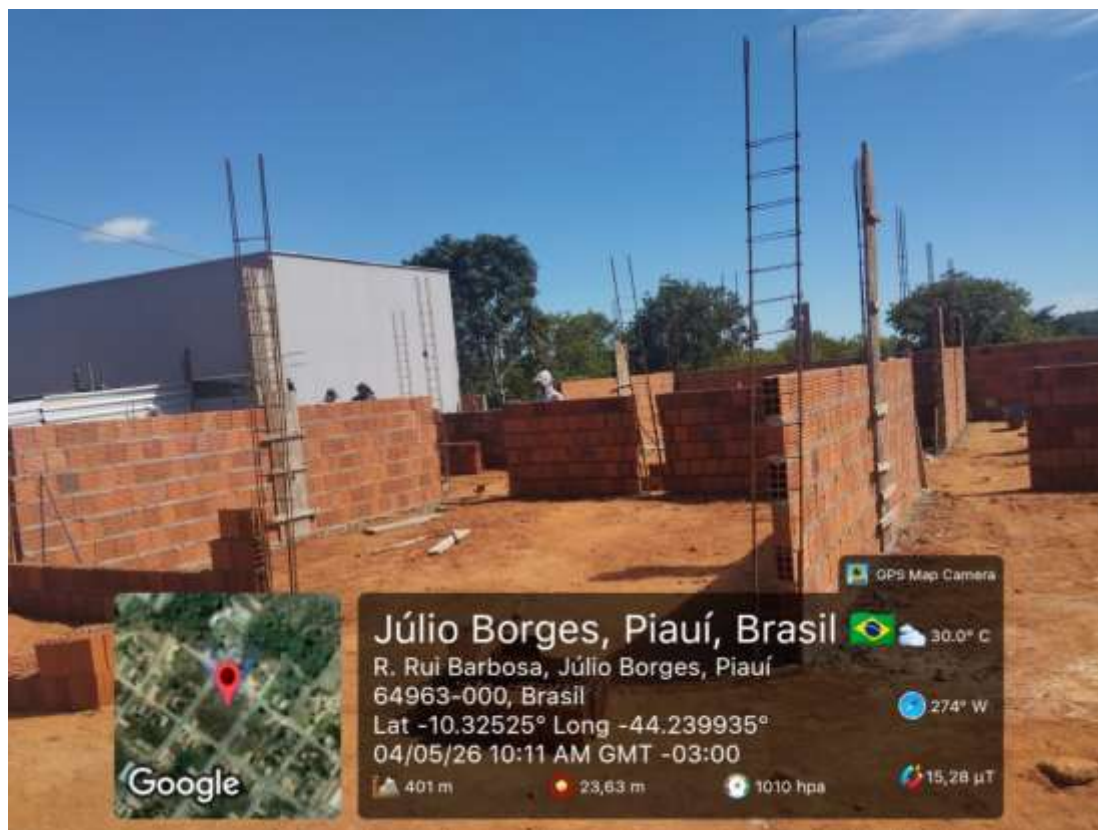


Foto 3: Levantamento de alvenaria de vedação, aterro e apiloamento



Foto 4: Execução de baldrame



Foto 5: Levantamento de alvenaria de vedação, aterro e apiloamento

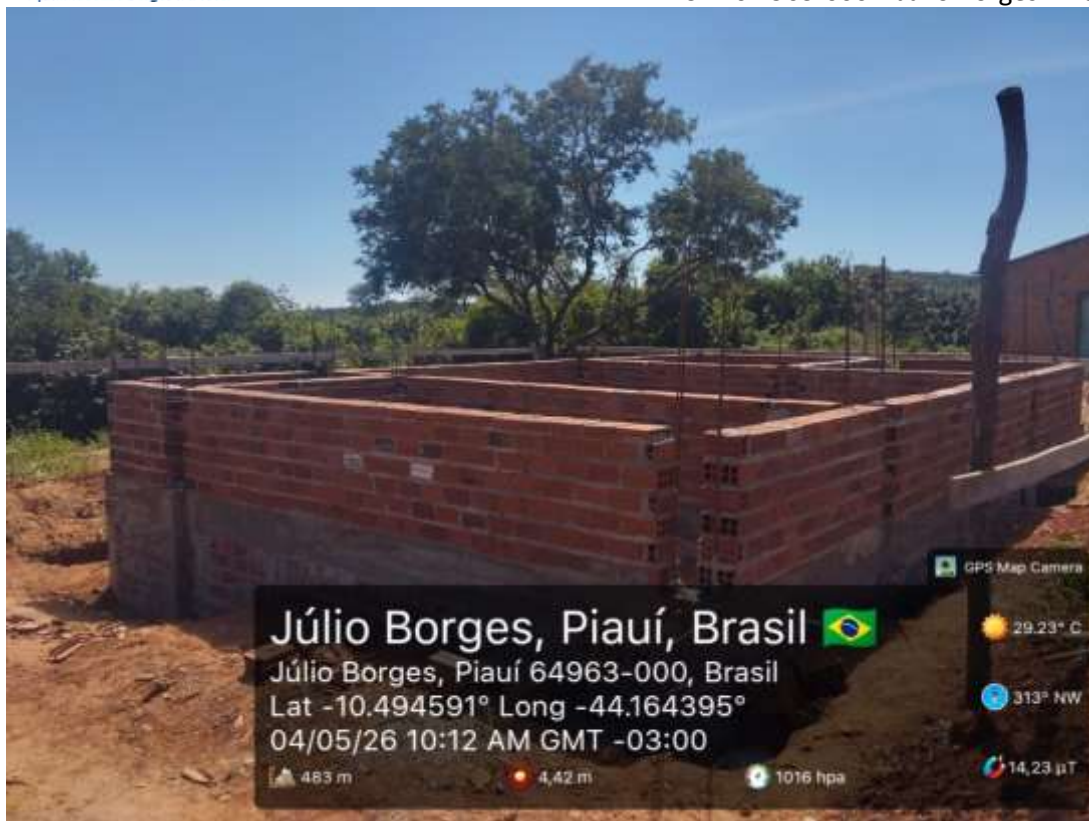


Foto 6: Execução de baldrame

---

JÉSSICA SANTOS RIBEIRO  
ENGENHEIRA FISCAL  
CREA/PI 1918271011
