

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MADALENA DE CARVALHO LOCALIZADA NO POVOADO SÃO MIGUEL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES/PI
SITUAÇÃO ATUAL:	EM ANDAMENTO
DATA DE INÍCIO:	23/02/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO:	31/08/2025
EMPRESA CONTRATADA:	WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 36.666.319/0001-06)
CONTRATO ADMINISTRATIVO:	Nº 134/2023
PERCENTUAL CONCLUÍDO:	95,90%



Foto 1: Cobogós instalados, pintura, revestimento e comunicação visual finalizados

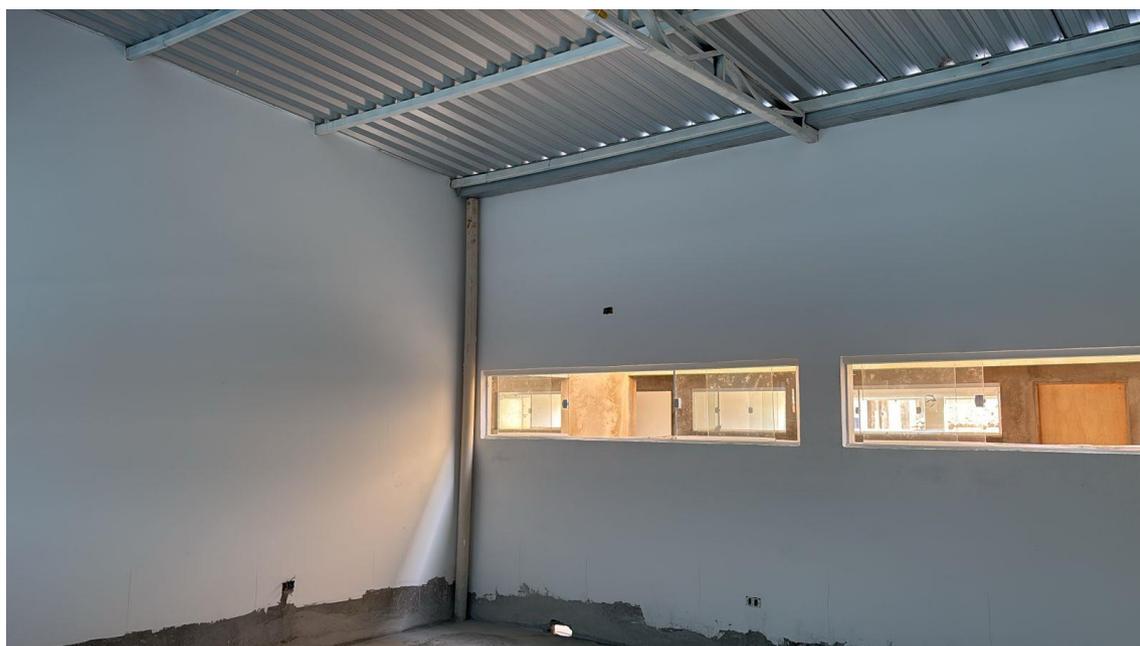


Foto 2: Telhado e esquadrias concluídos



Foto 3: Pintura das laterais em andamento



Foto 4: Condutores verticais instalados

JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRA FISCAL
CREA/PI 1918271011
