

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 121

ORDEM DE PAGAMENTO 06042

DATA: 09/09/2025

VENCTO:09/09/2025

PAGTO: 09/09/2025

Credor...: V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUC. CNPJ: 13.958.944/0001-18 Cod: 1964

Endereço: RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A TERCEIRA DE RESOLUÇÃO Nº 006/2022

Valor **159.489,86**

(cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 159.489,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62400	/ 2	GL 022001	12.361.1004.1107.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 159.489,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 159.489,86
TOTAL					RR\$ 159.489,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 159.489,86

Despesa Líquida: **RR\$ 159.489,86****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE ____/____/____



EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40.084-X		RR\$ 159.489,86
TOTAL . . .			RR\$ 159.489,86

09/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 40384-X PM QUEIMADA NOVA-PAR -

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 227319133
CNPJ 13.958.944/0001-18
Nome favorecido V DE S CAMPOS LOCACAO DE MAQUINAS E CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.901
Valor 159.489,86
Destinação 0
Data transferência 09/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7AC7B707B874C87

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

09/09/2025 16:27:12

09/09/2025 16:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	624001 / 2	Processo:	
Ficha	349	Data	09/09/2025	Requi	Venci 09/09/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIA			Cod	1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO		SN	PAULISTANA	64750-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

GL			
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	613173,56
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	Liqui	159489,86
12.361.1004.1107.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
613.173,56	326.953,72	159.489,86	286.219,84
159.489,86 cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos *****			

Autorizado

09/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

09/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	624001	Processo:		
Ficha	349	Data	24/06/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M			C.N.P.J.:13.958.944/0001-18	Cod	1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO			SN	PAULISTANA	64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

Fonde de Recurso STN:

1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

GL - Global	Poder Executivo Municipal	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 613173,56
02	OBRAS EM ANDAMENTO	Desc 0
4.4.90.51.91	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	Liqui 613173,56
12.361.1004.1107.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.251.786,28	0,00	613.173,56	638.612,72

613.173,56 seiscentos e treze mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****

Autorizado

24/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

24/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº061C/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 24 de junho de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 159.489,86** (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos) para a razão social **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUC.**, CNPJ:13.958.944/0001-18, situado a Rua Projetada cinquenta e cinco, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA – PI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº006/20222.**

Despesa a ser paga com Recurso do PAR – CONTA:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 569

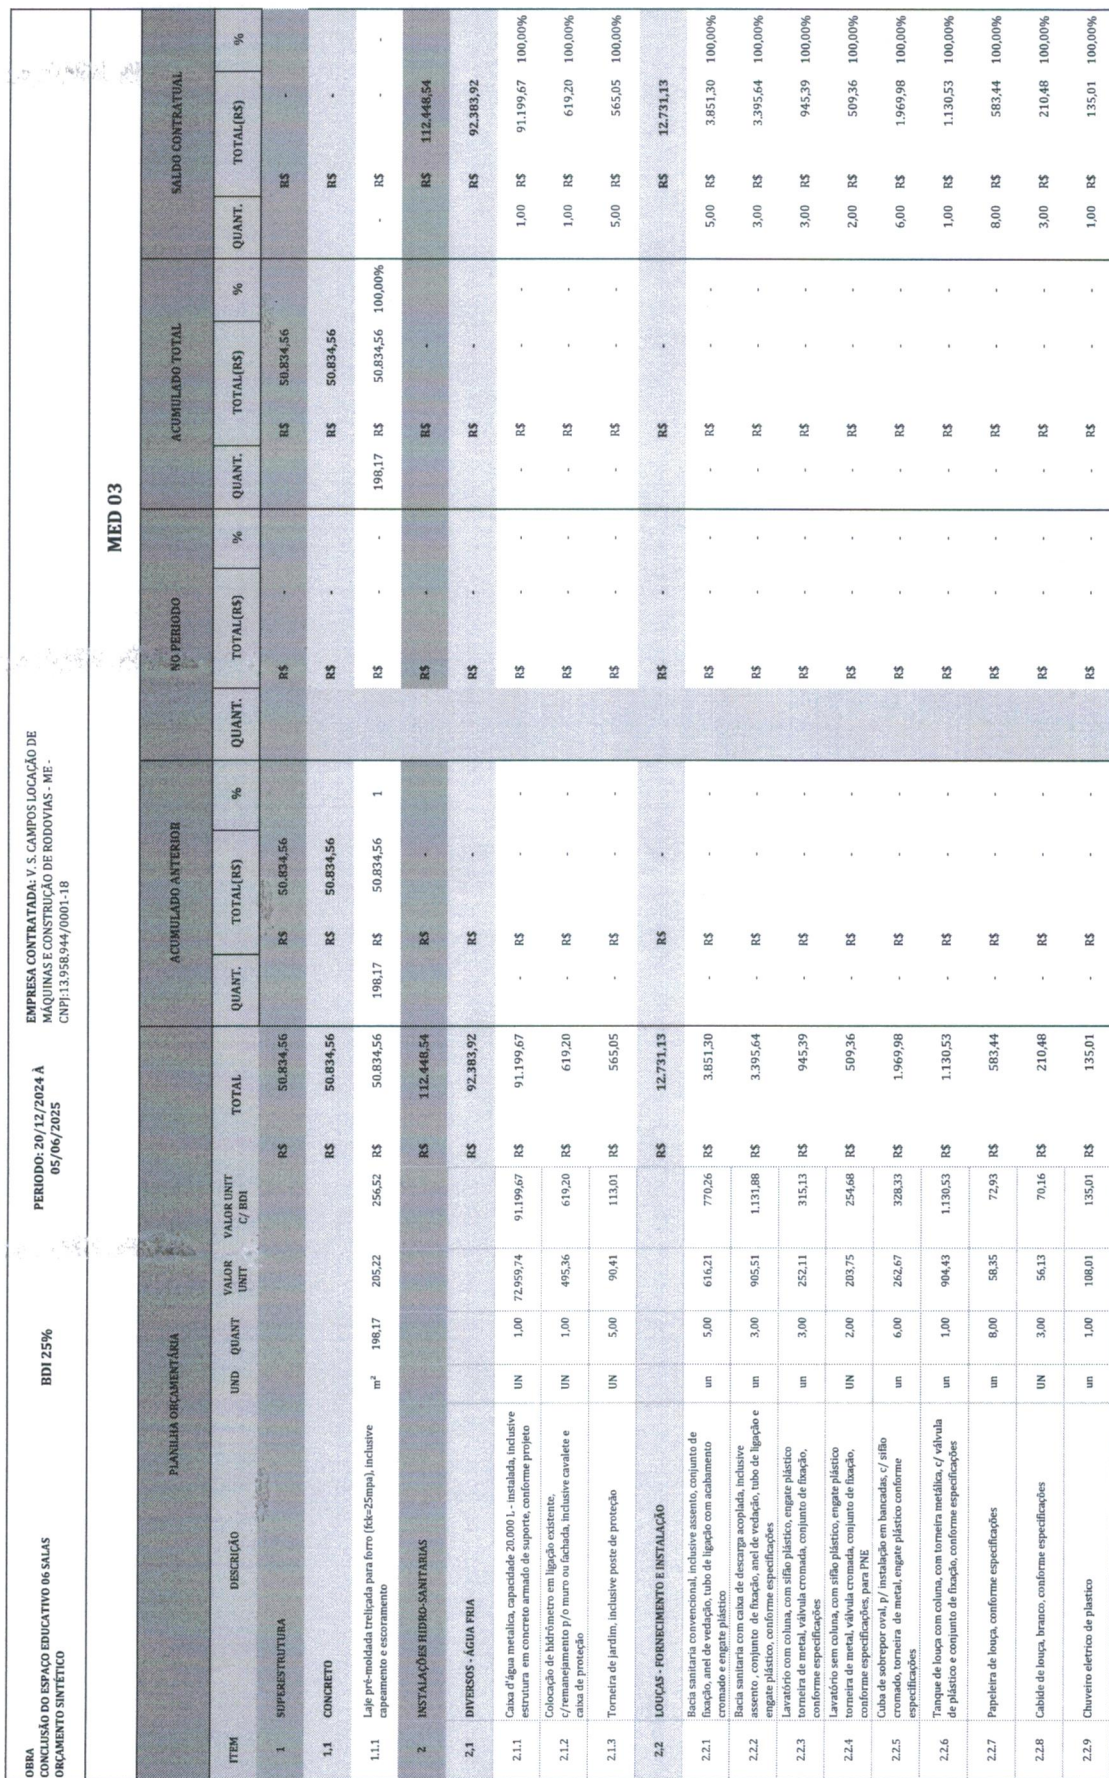
Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI		Número da Nota 000000221	
	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 08/09/2025 13:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação f1e5cc89	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: V DE S CAMPOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA				
CPF/CNPJ: 13.958.944/0001-18 Inscrição Municipal: 20337				
Endereço: RUA PARANA, 920 - MANINHO - CEP: 64750-000				
Município: Paulistana UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA				
CPF/CNPJ: 41.522.292/0001-80				
Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495 - CENTRO - CEP: 64758-000				
Município: Queimada Nova UF: PI Email: financeiroqn@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 047/2022 ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 006/2022 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS NA , ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI				
Tributável SIM	Item CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS	Qtde 1	Unitário R\$ 159.489,8600	Total R\$ 159.489,86
CHARLES DA SILVA DOURADO:00998359327 998359327 Assinado de forma digital por CHARLES DA SILVA DOURADO:00998359327 Data: 2025.09.08 13:41:08 -03'00'				
PLS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 159.489,86 VALOR LÍQUIDO: R\$ 159.489,86				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 159.489,86		Aliquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.189,80
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2025				
Local da Prestação do Serviço: Queimada Nova/PI				
Recolhimento: Sem incidência no município de Paulistana				
Tributação: Tributável				
CNAE: 4120-4/00-00				
Descrição da Atividade: Construção de edifícios				



2.3	METAIS					R\$	7.333,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.333,49	100,00%
2.3.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	UN	2,00	36,22	45,27	R\$	90,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	90,54	100,00%
2.3.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	417,02	521,27	R\$	2.606,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.606,35	100,00%
2.3.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	UN	9,00	54,50	68,12	R\$	613,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	613,08	100,00%
2.3.4	Cuba inox de embutir, em bancadas	un	2,00	421,90	527,37	R\$	1.054,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.054,74	100,00%
2.3.5	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2" x 80cm (bacia sanitária e micrômetro), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	6,00	294,91	368,63	R\$	2.211,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.211,78	100,00%
2.3.6	6 Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2" x 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	2,00	302,80	378,50	R\$	757,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	757,00	100,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e TELEFÔNICAS (380/20V)					R\$	82.996,84	R\$	7.940,92	9,57%	R\$	7.940,92	9,57%	R\$	75.055,92	90,43%
3.1	FIOS E CABOS					R\$	24.174,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.174,31	100,00%
3.1.1	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	900,00	5,39	6,73	R\$	6.057,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.057,00	100,00%
3.1.2	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	6,31	7,88	R\$	11.820,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.820,00	100,00%
3.1.3	Fio isolado em PVC seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	75,02	8,43	10,53	R\$	789,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	789,96	100,00%
3.1.4	Fio isolado em PVC seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	149,94	10,04	12,55	R\$	1.881,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.881,74	100,00%
3.1.5	Cabo isolado em PVC seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	75,00	15,18	18,97	R\$	1.422,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.422,75	100,00%
3.1.6	Cabo isolado em PVC seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	83,60	21,08	26,35	R\$	2.202,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.202,86	100,00%
3.2	CABO TELEFÔNICO					R\$	304,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	304,50	100,00%
3.2.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	M	70,00	2,32	2,90	R\$	203,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	203,00	100,00%
3.2.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	M	35,00	2,32	2,90	R\$	101,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	101,50	100,00%
3.3	INTERRUPTOR					R\$	364,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	364,40	
3.3.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	6,90	8,62	R\$	206,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	206,88	100,00%
3.3.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	11,46	14,32	R\$	157,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	157,52	100,00%
3.4	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					R\$	291,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	291,76	
3.4.1	Tomada para telefone, com caixa PVC, embutida	un	7,00	33,35	41,68	R\$	291,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	291,76	100,00%
3.5	TOMADAS DE ELÉTRICAS DE EMBUTIR					R\$	1.563,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.563,20	
3.5.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	57,00	19,84	24,80	R\$	1.413,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.413,60	100,00%
3.5.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00	23,94	29,92	R\$	149,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	149,60	100,00%

3.6	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					R\$	3.269,49	R\$	3.269,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.6.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	14,13	17,66	R\$	97,00	R\$	1.713,02	1	1.713,02	100,00%	-	R\$	-
3.6.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	17,72	22,15	R\$	5,00	R\$	110,75	1	110,75	100,00%	-	R\$	-
3.6.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	12,31	15,38	R\$	94,00	R\$	1.445,72	1	1.445,72	100,00%	-	R\$	-
3.7	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220 VOLTS					R\$	1.222,55	R\$	635,76				R\$	586,79	
3.7.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa branca, exclusive disjuntores	UN	1,00	508,61	635,76	R\$	1,00	R\$	635,76	1	635,76	100,00%	-	R\$	-
3.7.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	157,60	197,00	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	197,00
3.7.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	16,54	20,67	R\$	-	R\$	-	-	-	-	3,00	R\$	62,01
3.7.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	19,74	24,67	R\$	-	R\$	-	-	-	-	3,00	R\$	74,01
3.7.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	100,20	125,25	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	125,25
3.7.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	102,82	128,52	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	128,52
3.8	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380/220 VOLTS					R\$	978,31	R\$	635,76				R\$	342,55	
3.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	508,61	635,76	R\$	1,00	R\$	635,76	1	635,76	100,00%	-	R\$	-
3.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	102,82	128,52	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	128,52
3.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	16,54	20,67	R\$	-	R\$	-	-	-	-	2,00	R\$	41,34
3.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	19,74	24,67	R\$	-	R\$	-	-	-	-	7,00	R\$	172,69
3.9	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380/220 VOLTS					R\$	853,50	R\$	635,76				R\$	217,74	
3.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00	508,61	635,76	R\$	1,00	R\$	635,76	1	635,76	100,00%	-	R\$	-
3.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	100,20	125,25	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	125,25
3.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	16,54	20,67	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	20,67
3.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	19,74	24,67	R\$	-	R\$	-	-	-	-	2,00	R\$	49,34
3.9.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	17,99	22,48	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	22,48
3.10	CAIXA DE MEDIÇÃO					R\$	1.534,41	R\$	-				R\$	1.534,41	
3.10.1	Quadro de medição trifásico (acima de 10 kva) com caixa em porcel	UN	1,00	1.227,53	1.534,41	R\$	-	R\$	-	-	-	-	1,00	R\$	1.534,41
3.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					R\$	2.764,15	R\$	2.764,15				R\$	-	
3.11.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 6,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	442,27	552,83	R\$	5,00	R\$	2.764,15	1	2.764,15	100,00%	-	R\$	-

6.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.192,80	74,81	93,51	R\$	111.536,11	867,10	R\$	81.080,74	72,69%	325,70	R\$	30.455,37	27,31%	1.192,80	R\$	111.536,11	100,00%	-	R\$	-	
6.1.2	Cuneteira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	64,01	80,01	R\$	15.710,76	142,74	R\$	11.420,62	72,69%	53,62	R\$	4.290,13	27,31%	196,36	R\$	15.710,76	100,00%	-	R\$	-	
6.1.3	Estrutura para laje cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.192,80	87,73	109,66	R\$	130.802,44	867,10	R\$	95.086,18	72,69%	325,70	R\$	35.716,26	27,31%	1.192,80	R\$	130.802,44	100,00%	-	R\$	-	
6.2	CHAPAS					R\$	1.927,65		R\$	-			R\$	-			R\$	-		R\$	1.927,65		
6.2.1	Ruíno em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	M	24,60	62,69	78,36	R\$	1.927,65	-	R\$	-	-		R\$	-	-		R\$	-	-	24,60	R\$	1.927,65	
7	REVESTIMENTO					R\$	114.386,63		R\$	9.810,03			R\$	89.028,10			R\$	98.838,13			R\$	15.548,49	
7.1	MASSA					R\$	9.810,03		R\$	9.810,03			R\$	-			R\$	9.810,03			R\$	-	
7.1.1	Chapisco em leito com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	56,52	13,54	16,92	R\$	956,31	56,52	R\$	956,31	1		R\$	-	-		R\$	956,31	100,00%		R\$	-	
7.1.2	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2,6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	97,86	31,73	39,66	R\$	3.881,12	97,86	R\$	3.881,12	1		R\$	-	-		R\$	3.881,12	100,00%		R\$	-	
7.1.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2,9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	68,89	30,21	37,76	R\$	2.601,28	68,89	R\$	2.601,28	1		R\$	-	-		R\$	2.601,28	100,00%		R\$	-	
7.1.4	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2,6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa branca	m²	62,80	30,21	37,76	R\$	2.371,32	62,80	R\$	2.371,32	1		R\$	-	-		R\$	2.371,32	100,00%		R\$	-	
7.2	ACABAMENTO					R\$	104.576,60		R\$	-			R\$	89.028,10			R\$	89.028,10			R\$	15.548,49	
7.2.1	Revestimento cerâmico para parede, por - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40	109,31	136,63	R\$	104.576,60	-	R\$	-	-		651,60	R\$	89.028,10	85,13%	651,60	R\$	89.028,10	85,13%	113,80	R\$	15.548,49
8	PAVIMENTAÇÃO					R\$	188.979,21		R\$	77.035,14			R\$	-			R\$	77.035,14			R\$	111.944,07	
8.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA					R\$	53.538,98		R\$	53.538,98			R\$	-			R\$	53.538,98			R\$	-	
8.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	62,97	680,19	850,23	R\$	53.538,98	62,97	R\$	53.538,98	1		R\$	-	-		R\$	53.538,98	100,00%		R\$	-	
8.2	ACABAMENTO					R\$	111.944,07		R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	111.944,07	
8.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, por-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	113,76	142,20	R\$	111.944,07	-	R\$	-	-			R\$	-	-		R\$	-	-	787,23	R\$	111.944,07
8.3	CALÇADA EM CONCRETO					R\$	23.496,16		R\$	23.496,16			R\$	-			R\$	23.496,16			R\$	-	
8.3.1	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m³	168,13	111,80	139,75	R\$	23.496,16	168,13	R\$	23.496,16	1		R\$	-	-		R\$	23.496,16	100,00%		R\$	-	
9	SOLEIRA E RODAPÉ					R\$	3.491,50		R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	3.491,50	
9.1	SOLEIRA					R\$	2.232,62		R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	2.232,62	
9.1.1	Soeira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	67,40	84,25	R\$	2.232,62	-	R\$	-	-		R\$	-	-		R\$	-	-	26,50	R\$	2.232,62	
9.2	RODAPÉ					R\$	1.258,88		R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	1.258,88	
9.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	17,99	22,48	R\$	1.258,88	-	R\$	-	-		R\$	-	-		R\$	-	-	56,00	R\$	1.258,88	
10	PINTURAS					R\$	91.007,40		R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	91.007,40	

10.1	ACRILICA				R\$	78.255,53	R\$	-	R\$	-	R\$	78.255,53
10.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	978,56	38,97	48,71	R\$	47.665,65	-	R\$	-	978,56	R\$ 47.665,65 100,00%
10.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00	38,97	48,71	R\$	30.589,88	-	R\$	-	628,00	R\$ 30.589,88 100,00%
10.2	ESMALTE					R\$	12.751,87	-	R\$	-	R\$	R\$ 12.751,87
10.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	87,56	18,34	22,92	R\$	2.006,87	-	R\$	-	87,56	R\$ 2.006,87 100,00%
10.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00	17,82	22,27	R\$	6.146,52	-	R\$	-	276,00	R\$ 6.146,52 100,00%
10.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,20	25,34	31,67	R\$	4.598,48	-	R\$	-	145,20	R\$ 4.598,48 100,00%
11	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					R\$	74.199,19	-	R\$	-	R\$	R\$ 74.199,19
11.1	CONCRETO					R\$	2.291,97	-	R\$	-	R\$	R\$ 2.291,97
11.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	169,78	212,22	R\$	2.291,97	-	R\$	-	10,80	R\$ 2.291,97 100,00%
11.2	BANCADA					R\$	21.243,68	-	R\$	-	R\$	R\$ 21.243,68
11.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para piaça conforme projeto	UN	2,00	2.186,86	2.733,57	R\$	5.467,14	-	R\$	-	2,00	R\$ 5.467,14 100,00%
11.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodapié 7 cm, assentada.	UN	1,00	1.296,12	1.620,15	R\$	1.620,15	-	R\$	-	1,00	R\$ 1.620,15 100,00%
11.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodapié 7 cm, e piaçadeira 2cm assentada.	UN	1,00	2.079,34	2.599,17	R\$	2.599,17	-	R\$	-	1,00	R\$ 2.599,17 100,00%
11.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UN	1,00	2.806,40	3.508,00	R\$	3.508,00	-	R\$	-	1,00	R\$ 3.508,00 100,00%
11.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	UN	2,00	3.219,69	4.024,61	R\$	8.049,22	-	R\$	-	2,00	R\$ 8.049,22 100,00%
11.3	MADERA					R\$	9.818,13	-	R\$	-	R\$	R\$ 9.818,13
11.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giratória e placa alfabética, conforme especificações	m²	31,92	167,49	209,36	R\$	6.682,77	-	R\$	-	31,92	R\$ 6.682,77 100,00%
11.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	396,03	495,03	R\$	742,54	-	R\$	-	1,50	R\$ 742,54 100,00%
11.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	200,66	250,82	R\$	2.392,82	-	R\$	-	9,54	R\$ 2.392,82 100,00%
11.4	INCÊNDIO					R\$	6.193,36	-	R\$	-	R\$	R\$ 6.193,36
11.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio de 5m, tempo de descarga 16s, NBR9413, 9444, 10721	UN	8,00	619,34	774,17	R\$	6.193,36	-	R\$	-	8,00	R\$ 6.193,36 100,00%
11.5	GAZ					R\$	1.213,03	-	R\$	-	R\$	R\$ 1.213,03
11.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 3/4"	M	7,00	56,62	73,27	R\$	512,89	-	R\$	-	7,00	R\$ 512,89 100,00%
11.5.2	Covelo em aço forjado classe 10 3/4" x 90°	UN	5,00	65,50	81,87	R\$	409,35	-	R\$	-	5,00	R\$ 409,35 100,00%
11.5.3	Te em aço forjado classe 10 3/4"	UN	1,00	21,33	26,66	R\$	26,66	-	R\$	-	1,00	R\$ 26,66 100,00%

11.5.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	UN	2,00	61,38	76,72	R\$	153,44	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	2,00	R\$	153,44	100,00%
11.5.5	Registro esfera ø 3/4"	UN	1,00	49,89	62,36	R\$	62,36	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	1,00	R\$	62,36	100,00%
11.5.6	Luva em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	12,89	16,11	R\$	48,33	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	3,00	R\$	48,33	100,00%
11.6	VIDROS					R\$	33.439,02	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	-	R\$	33.439,02	100,00%
11.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	325,56	406,95	R\$	25.466,93	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	62,58	R\$	25.466,93	100,00%
11.6.2	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	201,11	251,38	R\$	527,89	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	2,10	R\$	527,89	100,00%
11.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	522,40	653,00	R\$	7.444,20	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	11,40	R\$	7.444,20	100,00%
12	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					R\$	7.980,48	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	-	R\$	7.980,48	
12.1	REDE LÓGICA					R\$	7.980,48	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	-	R\$	7.980,48	
12.1.1	Curva 90° p/ eletroduto roscaivel 1.1/4"	un	26,00	12,42	15,52	R\$	403,52	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	26,00	R\$	403,52	100,00%
12.1.2	Luva pvc roscaivel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	5,41	6,76	R\$	304,20	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	45,00	R\$	304,20	100,00%
12.1.3	Bucha/Arquela aluminio 1.1/4"	UN	45,00	12,98	16,22	R\$	729,90	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	45,00	R\$	729,90	100,00%
12.1.4	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	4,24	5,30	R\$	689,00	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	130,00	R\$	689,00	100,00%
12.1.5	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	11,35	14,18	R\$	2.906,90	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	205,00	R\$	2.906,90	100,00%
12.1.6	Oburador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	353,80	442,25	R\$	442,25	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	1,00	R\$	442,25	100,00%
12.1.7	Quadro de distribuçao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metalica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	UN	1,00	251,19	313,98	R\$	313,98	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	1,00	R\$	313,98	100,00%
12.1.8	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	UN	19,00	44,63	55,78	R\$	1.059,82	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	19,00	R\$	1.059,82	100,00%
12.1.9	Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4" - 2 saídas	UN	19,00	28,96	36,20	R\$	687,80	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	19,00	R\$	687,80	100,00%
12.1.10	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebras - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	44,71	R\$	223,55	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	5,00	R\$	223,55	100,00%
12.1.11	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto	un	22,00	7,99	9,98	R\$	219,56	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	22,00	R\$	219,56	100,00%
13	PORTAL DE ACESSO					R\$	8.305,57	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	-	R\$	8.305,57	
13.1	MURO E PECHOS					R\$	4.470,25	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	-	R\$	4.470,25	
13.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	M	7,25	236,23	295,28	R\$	2.140,78	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	7,25	R\$	2.140,78	100,00%
13.1.2	Portão de abrir em metalao 40x40mm c/ 10cm Zils	m²	4,20	432,54	540,67	R\$	2.270,81	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	4,20	R\$	2.270,81	100,00%
13.1.3	Tirante com rosca total, ref. DN-48, Ø 1 1/4" x 600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	un	2,00	23,47	29,33	R\$	58,66	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	2,00	R\$	58,66	100,00%
13.2	COBERTURA					R\$	3.835,32	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	-	R\$	3.835,32	

13.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	15,60	877,3	109,66	R\$	1.710,69	-	R\$	-	-	R\$	-	15,60	R\$	1.710,69	100,00%
13.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recortado	m²	9,20	76,22	95,27	R\$	876,48	-	R\$	-	-	R\$	-	9,20	R\$	876,48	100,00%
13.2.3	Cuneeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	64,01	80,01	R\$	1.248,15	-	R\$	-	-	R\$	-	15,60	R\$	1.248,15	100,00%
14	LIMPEZA DA OBRA					R\$	2.286,57	-	R\$	-	-	R\$	-		R\$	2.286,57	
14.1	LIMPEZA					R\$	2.286,57	-	R\$	-	-	R\$	-		R\$	2.286,57	
14.1.1	Limpeza geral	m²	853,20	215	2,68	R\$	2.286,57	-	R\$	-	-	R\$	-	853,20	R\$	2.286,57	100,00%
							R\$	334.291,69	R\$	159.489,86	15,33%	R\$	493.781,56	47,47%	R\$	546.425,77	52,53%

CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

CHARLES DA SILVA
Assinado de forma digital
por CHARLES DA SILVA
DOURADO:00998359327
59327

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA CAMPO:
Data: 08/09/2025 12:14:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHARLES DA SILVA DOURADO - ENG FISCAL - 151002101-6
