



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 14:27:55
Competência 02/2026
Número / Série 203 / U
Código de Verificação dCCTAh5R

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 12.168.811/0001-85
Nome / Nome Empresarial RIGA CONSTRUTORA LTDA
Endereço AVENIDA JOAO XXIII 4661 SETOR B SALA 9 SANTA ISABEL
Inscrição Municipal 040546-9
Telefone (86) 8103-8176
E-mail CONTATO@CONSULTCONTABIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64053-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 06.553.929/0001-24
Nome / Nome Empresarial PREFEITURA MUNICIPAL E PEDRO II
Endereço PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO
Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município PEDRO II / PI BRASIL
CEP 64255-000


SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
Serviço 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço PEDRO II / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª e ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO N 113/2025, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II Concorrência Eletrônica n° 001/2025, Processo Administrativo n°. 608/2025 CPL. Recursos específicos consignados no orçamento municipal, a saber, novo PAC, Proposta n. 001398/2024, TRANSFEREGOV n.960076, Ministério dos Esportes.

BASE DE CÁLCULO R\$ 343.960,08
VALOR DE DEDUÇÃO R\$ 343.960,08 X 40% = R\$ 137.584,03
VALOR DE SERVIÇO R\$ 343.960,08 X 60% = R\$ 206.376,05



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN PEDRO II - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Alíq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 343.960,08 | 137.584,03 | 0,00 | 206.376,05 | 3,000000 | 6.191,28 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 6.191,28 | 4.127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Desc. condicionado (R\$) | Valor Líquido da NFSe (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 206.376,05 | 10.318,80 | 0,00 | 0,00 | 333.641,28 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PUBLICO

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO 960076/2024 | Nº SICONV 960076/2024 | GESTOR MINISTERIO DO ESPORTE | PROGRAMA NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS | AÇÃO / MODALIDADE Termo de Compromisso | RECURSO OGU PAC |
| PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO IIPI | MUNICÍPIO / UF PEDRO IIPI | LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA | REPERTE 1.462.500,00 | VALORES CONTRATADOS (R\$) | |
| OBJETO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO | REPERTE 1.462.500,00 | CONTRAPARTIDA 0,00 | INVESTIMENTO 1.462.500,00 | |

Situação do TC/CR: **Adiantada**
 Percentual previsto em: **0,63%**
 fev-26

Medição nº: **4** Saldo a Reprogramar: **36.555,37**
 Repasse (R\$) **36.555,37** Contrapartida (R\$) **0,00**


| Etapa | Meta / Sub-Meta | Descrição da Meta / Sub-Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEF | nº do BM | Valor Total (R\$) | Valores Medidos (R\$) | | | Execução Física Acum. |
|-------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Acum. Anterior | No Período | Acum. incluindo o Período | |
| | TOTAL | | | | | Repasso CP. Financ. Outros | | 1.081.984,55 | 0,00 | 0,00 | 1.425.944,63 | 100,00% |
| | | | | | | Investimento | | 1.081.984,55 | 0,00 | 0,00 | 1.425.944,63 | 100,00% |
| 1 | Meta 1. | CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO | Licitado / Em Execução | 1,00 | un | 001/2024 | 1 | 1.081.984,55 | 343.960,08 | 343.960,08 | 1.425.944,63 | 100,00% |

Acumulado Anterior: 75,88%

Observações:

Local: Pedro II PI

Data: 27 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico

 Nome: LINDA JESSICA SOTERO ALVES
 Cargo: ENGENHEIRA FISCAL
 ART/RRT Fiscal: .1920250001672

Assinado de forma digital por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 Dados: 2026.03.02 08:14:35 -03'00'

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Social
 Nome:
 Cargo:

Responsável Financeiro
 Nome:
 Cargo:

○ Visita de Campo

● Vistoria de Medição

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|----------|
| Nº SIAPF / SIGF 960076/2024 | Nº Convênio TGOV 960076/2024 | Conveniente / Recebedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II | UF PI |
|--------------------------------|---------------------------------|---|----------|

Objeto
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº CTEF 003866/2024 | Empresa executora RIGA CONSTRUTORA LTDA | Data de assinatura 29/05/2025 | Valor vigente R\$ 1.425.944,63 |
|------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|

Descrição da meta / submeta
EXECUÇÃO DE DRENAGEM, ALAMBRADO E MURETA

Localidade / Endereço da obra
BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II - PI

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

| Nº Medição | Data de fechamento | Data da vistoria | Valor medido no período | Valor medido acumulado | % Acum. |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| 04 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | R\$ 343.960,08 | R\$ 1.425.944,63 | |

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS




PLACA DE OBRA



ALAMBRADO, PISTA DE CORRIDA, GRAMA NATURAL E CAMPO SINTÉTICO



MESAS E POSTE DE ILUMINAÇÃO

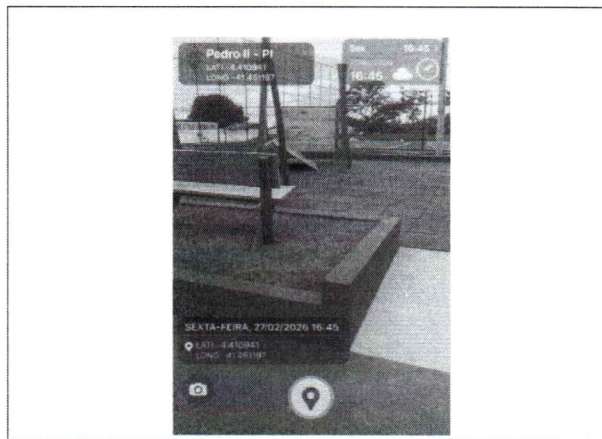

PISTA DE CORRIDA



ALAMBRADO E IUMNAÇÃO DE AREA DE LAZER



GRAMA SINTÉTICA E CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL
(Coordenadas, comentários, etc.)



MEIA QUADRA DE BASQUETE



(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

5 2 DATA E ASSINATURA

Observações

PEDRO II - PI, 02/03/2026
Local e data

Profissional responsável
Nome: VICTOR ANDRADE DE CARVALHO

Profissional responsável
Nome:

André Jéssica Sora Alves

Obra: PEDRO II - CENTRO ESPORTIVO

Endereço:

Descrição: CENTRO ESPORTIVO - PEDRO II (Proposta Riga)



Orçamento Sintético

Bases: SINAPI PI 2024-10, Lic_Propria (própria), SEINFRA CE 028, Cotação (própria)

BDI: 25,03%

Encargos sociais:

| Item | Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unitário | Valor unitário de venda | Total | 4ª MEDIÇÃO | SALDO |
|--|------------|-----------------------|--|------|---------|----------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 96.584,77 | | | | | | | | | | |
| 11 | 103689 | SINAPI PI 2024-10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,48 | R\$ 450,11 | R\$ 562,77 | R\$ 3.646,74 | | |
| 12 | 98459 | SINAPI PI 2024-10 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 212,40 | R\$ 84,82 | R\$ 106,05 | R\$ 22.525,02 | | |
| 13 | ADM | Lic_Propria (própria) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | R\$ 42.929,58 | R\$ 53.674,85 | R\$ 53.674,85 | 0,25 | 13418,713 |
| 14 | 99059 | SINAPI PI 2024-10 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 118,00 | R\$ 54,74 | R\$ 68,44 | R\$ 8.075,92 | | |
| 15 | C0370 | SEINFRA CE | BARRIÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | R\$ 8.612,14 | R\$ 8.642,24 | R\$ 8.642,24 | | |
| 2 CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA R\$ 504.437,01 | | | | | | | | | | |
| 2.1 FUNDAÇÃO R\$ 9.738,52 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 97082 | SINAPI PI 2024-10 | ESCVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 26,00 | R\$ 58,39 | R\$ 73,00 | R\$ 1.898,00 | | |
| 2.1.2 | 97094 | SINAPI PI 2024-10 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 104,00 | R\$ 0,84 | R\$ 0,80 | R\$ 83,20 | | |
| 2.1.3 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 62,40 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 3.382,08 | | |
| 2.1.4 | 89470 | SINAPI PI 2024-10 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 43,70 | R\$ 80,08 | R\$ 100,12 | R\$ 4.375,24 | | |
| 2.2 PAVIMENTAÇÃO R\$ 231.735,27 | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | 100576 | SINAPI PI 2024-10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1450,00 | R\$ 2,07 | R\$ 2,58 | R\$ 3.741,00 | | |
| 2.2.2 | C001 | Lic_Propria (própria) | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 140,00 | R\$ 307,33 | R\$ 384,25 | R\$ 53.795,00 | | |
| 2.2.3 | C002 | Lic_Propria (própria) | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70,00 | R\$ 355,44 | R\$ 444,40 | R\$ 31.108,00 | | |
| 2.2.4 | C003 | Lic_Propria (própria) | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70,00 | R\$ 355,44 | R\$ 444,40 | R\$ 31.108,00 | | |
| 2.2.5 | 10042/GRSE | Lic_Propria (própria) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | M2 | 1400,00 | R\$ 60,32 | R\$ 75,41 | R\$ 105.574,00 | | |
| 2.2.6 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 50,01 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 2.710,54 | | |
| 2.2.7 | C008 | Lic_Propria (própria) | EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | M2 | 50,01 | R\$ 59,16 | R\$ 73,96 | R\$ 3.698,73 | | |
| 2.3 ESTRUTURA R\$ 38.501,32 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | 96542 | SINAPI PI 2024-10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 79,30 | R\$ 94,58 | R\$ 118,22 | R\$ 9.374,84 | | |
| 2.3.2 | 96543 | SINAPI PI 2024-10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 122,00 | R\$ 19,72 | R\$ 24,65 | R\$ 3.007,30 | | |
| 2.3.3 | 96545 | SINAPI PI 2024-10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 276,00 | R\$ 16,48 | R\$ 20,60 | R\$ 5.685,60 | | |
| 2.3.4 | 96555 | SINAPI PI 2024-10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5,95 | R\$ 900,91 | R\$ 1.126,40 | R\$ 6.702,08 | | |
| 2.3.5 | C007 | Lic_Propria (própria) | ESTACA BROCA DE CONCRETO(0,20X0,20)M, ESCVAÇÃO MANUAL COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | UN | 58,00 | R\$ 189,36 | R\$ 236,75 | R\$ 13.731,50 | | |
| 2.4 ALVENARIA E FECHAMENTO R\$ 183.733,69 | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | 103325 | SINAPI PI 2024-10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79,00 | R\$ 76,32 | R\$ 95,42 | R\$ 7.538,18 | | |
| 2.4.2 | 102362 | SINAPI PI 2024-10 | ALAMBADO PARA QUADRA E ESCORAS DE GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BSWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 876,90 | R\$ 160,71 | R\$ 200,93 | R\$ 176.195,51 | | |
| 2.5 REVESTIMENTO R\$ 8.508,30 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------------------|--|-----|--------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2.5.1 | 87878 | SINAPI PI 2024-10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 158,00 | R\$ 4,87 | R\$ 6,08 | R\$ 960,64 | | | | |
| 2.5.2 | 87530 | SINAPI PI 2024-10 | PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. | M2 | 158,00 | R\$ 38,21 | R\$ 47,77 | R\$ 7.547,66 | | | | |
| 2.6 | | | PINTURA | | | | | R\$ 27.001,64 | | | | |
| 2.6.1 | 104642 | SINAPI PI 2024-10 | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 158,00 | R\$ 9,60 | R\$ 12,00 | R\$ 1.896,00 | | | | |
| 2.6.2 | 100750 | SINAPI PI 2024-10 | AF_04/2023 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 876,90 | R\$ 22,90 | R\$ 28,63 | R\$ 25.105,64 | | | | |
| 2.7 | | | EQUIPAMENTOS | | | | | R\$ 5.218,27 | | | | |
| 2.7.1 | C005 | Lic_Propria (própria) | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00X2,20M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R\$ 4.173,62 | R\$ 5.218,27 | R\$ 5.218,27 | | | | |
| 3 | | | MEIA QUADRA DE BASQUETE | | | | | R\$ 214.144,39 | | | | |
| 3.1 | | | FUNDAÇÃO | | | | | R\$ 4.168,98 | | | | |
| 3.1.1 | 97082 | SINAPI PI 2024-10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 10,50 | R\$ 58,39 | R\$ 73,00 | R\$ 766,50 | | | | |
| 3.1.2 | 97084 | SINAPI PI 2024-10 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 30,00 | R\$ 0,64 | R\$ 0,80 | R\$ 24,00 | | | | |
| 3.1.3 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 18,00 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 975,60 | | | | |
| 3.1.4 | 89470 | SINAPI PI 2024-10 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 24,00 | R\$ 80,08 | R\$ 100,12 | R\$ 2.402,88 | | | | |
| 3.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 205.207,46 | | | | |
| 3.2.1 | 100576 | SINAPI PI 2024-10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. | M2 | 221,00 | R\$ 2,07 | R\$ 2,58 | R\$ 570,18 | | | | |
| 3.2.2 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | AF_09/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 221,00 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 11.978,20 | | | | |
| 3.2.3 | 94994 | SINAPI PI 2024-10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 221,00 | R\$ 107,00 | R\$ 133,78 | R\$ 29.565,38 | | | | |
| 3.2.4 | COT010 | Lic_Propria (própria) | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DE MARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 130.443,66 | R\$ 163.093,70 | R\$ 163.093,70 | | | | |
| 3.3 | | | EQUIPAMENTOS | | | | | R\$ 4.767,95 | | | | |
| 3.3.1 | C006 | Lic_Propria (própria) | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R\$ 3.813,45 | R\$ 4.767,95 | R\$ 4.767,95 | | | | |
| 4 | | | PARQUINHO INFANTIL | | | | | R\$ 194.610,14 | | | | |
| 4.1 | | | FUNDAÇÃO | | | | | R\$ 3.474,15 | | | | |
| 4.1.1 | 97082 | SINAPI PI 2024-10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 8,75 | R\$ 58,39 | R\$ 73,00 | R\$ 638,75 | | | | |
| 4.1.2 | 97084 | SINAPI PI 2024-10 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 25,00 | R\$ 0,64 | R\$ 0,80 | R\$ 20,00 | | | | |
| 4.1.3 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 15,00 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 813,00 | | | | |
| 4.1.4 | 89470 | SINAPI PI 2024-10 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 20,00 | R\$ 80,08 | R\$ 100,12 | R\$ 2.002,40 | | | | |
| 4.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 130.471,46 | | | | |
| 4.2.1 | 100576 | SINAPI PI 2024-10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. | M2 | 142,84 | R\$ 2,07 | R\$ 2,58 | R\$ 368,52 | | | | |
| 4.2.2 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | AF_09/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 142,84 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 7.741,92 | | | | |
| 4.2.3 | 87702 | SINAPI PI 2024-10 | CONJUNTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 142,84 | R\$ 62,43 | R\$ 78,05 | R\$ 11.148,66 | | | | |
| 4.2.4 | 101735 | SINAPI PI 2024-10 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. | M2 | 142,84 | R\$ 622,72 | R\$ 778,58 | R\$ 111.212,36 | | | | |

| 4.3 EQUIPAMENTOS | | | | | | | | R\$ 60.664,53 | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---|----|--------|---------------|---------------|-----------------------|--------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | COT001 | Lic_Propria (própria) | PARQUE ESCADADA (2,00 X 1,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR-FORNECIMENTO | UN | 2,00 | R\$ 5.697,84 | R\$ 7.124,00 | R\$ 14.248,00 | | | |
| | | | FORNECIMENTO E MONTAGEM BANCOS(0,30X0,30)M EM MADEIRA PINUS | | | | | | 2 | 14248 | 0 |
| 4.3.2 | COT002 | Lic_Propria (própria) | PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,REF.MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 3.598,64 | R\$ 4.499,37 | R\$ 4.499,37 | | | |
| | | | FORNECIMENTO E MONTAGEM BANCOS(0,30X0,30)M EM MADEIRA PINUS | | | | | | 1 | 4499,37 | 0 |
| 4.3.3 | COT003 | Lic_Propria (própria) | OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EMVERNIZ FOSCO, CONTEUDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR,1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS,REF.MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 23.990,94 | R\$ 29.995,87 | R\$ 29.995,87 | | | |
| | | | FORNECIMENTO E MONTAGEM BANCOS(0,30X0,30)M EM MADEIRA PINUS | | | | | | 1 | 29995,87 | 0 |
| 4.3.4 | COT006 | Lic_Propria (própria) | PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,REF.MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 2.698,98 | R\$ 3.374,53 | R\$ 3.374,53 | | | |
| | | | FORNECIMENTO E MONTAGEM BANCOS(0,30X0,30)M EM MADEIRA PINUS | | | | | | 1 | 3374,53 | 0 |
| 4.3.5 | COT004 | Lic_Propria (própria) | OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,REF.MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E | UN | 6,00 | R\$ 1.139,30 | R\$ 1.424,46 | R\$ 8.546,76 | | | |
| | | | MONTAGEM | | | | | | 6 | 8546,76 | 0 |
| 5 PISTA DE CAMINHADA | | | | | | | | R\$ 163.882,38 | | | |
| 5.1 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 116.906,64 | | | |
| | | | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 100576 | SINAPI PI 2024-10 | DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. | M2 | 613,49 | R\$ 2,07 | R\$ 2,58 | R\$ 1.582,80 | | | |
| | | | AF_09/2024 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 613,49 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 33.251,15 | | | |
| | | | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | | | | | | 313,49 | 16991,158 | 0 |
| 5.1.3 | 94994 | SINAPI PI 2024-10 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 613,49 | R\$ 107,00 | R\$ 133,78 | R\$ 82.072,69 | | | |
| | | | | | | | | | 313,49 | 41938,692 | 0 |
| 5.2 PINTURA | | | | | | | | R\$ 46.975,72 | | | |
| | | | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | 102494 | SINAPI PI 2024-10 | MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 613,49 | R\$ 57,85 | R\$ 72,32 | R\$ 44.367,59 | | | |
| | | | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 | | | | | | 613,49 | 44367,597 | 0 |
| 5.2.2 | 102506 | SINAPI PI 2024-10 | POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 | M | 204,72 | R\$ 10,19 | R\$ 12,74 | R\$ 2.608,13 | | | |
| | | | | | | | | | 204,72 | 2608,1328 | 0 |
| 6 IMPLANTAÇÃO GERAL | | | | | | | | R\$ 262.305,96 | | | |
| 6.1 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | R\$ 41.744,47 | | | |
| | | | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | 100576 | SINAPI PI 2024-10 | DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. | M2 | 214,22 | R\$ 2,07 | R\$ 2,58 | R\$ 552,68 | | | |
| | | | AF_09/2024 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | 95241 | SINAPI PI 2024-10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 214,22 | R\$ 43,35 | R\$ 54,20 | R\$ 11.610,72 | | | |
| | | | EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA)OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | C008 | Lic_Propria (própria) | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 214,22 | R\$ 59,16 | R\$ 73,96 | R\$ 15.843,71 | | | |
| | | | ASSEIAMENTO DE GRAMA (MERCURIO) EM RECTANGULO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSIOS. AF_01/2024 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | 94279 | SINAPI PI 2024-10 | FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSIOS. AF_01/2024 | M | 140,70 | R\$ 38,23 | R\$ 47,79 | R\$ 6.724,05 | | | |
| | | | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.5 | 103946 | SINAPI PI 2024-10 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 291,85 | R\$ 18,95 | R\$ 23,69 | R\$ 6.913,92 | | | |
| | | | | | | | | | 291,85 | 6913,9265 | 0 |
| 6.1.6 | 08637/ORSE | Lic_Propria (própria) | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 1,50 | R\$ 53,00 | R\$ 66,26 | R\$ 99,39 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | | | | R\$ 61.780,54 | | | |
| | | | BANCOS(0,30X0,30)M EM MADEIRA PINUS | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | COT004 | Cotação (própria) | OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,REF.MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4,00 | R\$ 1.139,30 | R\$ 1.424,46 | R\$ 5.697,84 | | | |
| | | | CESTÃO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS | | | | | | 4 | 5697,84 | 0 |
| 6.2.2 | COT005 | Lic_Propria (própria) | OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,REF.MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 16,00 | R\$ 899,66 | R\$ 1.124,84 | R\$ 17.997,44 | | | |
| | | | MESA PARA JARDIM(1,00X1,00)M COM 4 BANCOS(0,30X0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | | | | | | 16 | 17997,44 | 0 |
| 6.2.3 | COT007 | Lic_Propria (própria) | OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4,00 | R\$ 3.298,75 | R\$ 4.124,42 | R\$ 16.497,68 | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 16497,68 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------|---|-----|--------|--------------|--------------|----------------------|-------|---------|---|---|
| 6.2.4 | COT008 | Lic_Propria (própria) | CUNJUNTO MESA (1,00X2,00)M E 2 BANCOS (0,30X2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM | UN | 2,00 | R\$ 5.697,84 | R\$ 7.124,00 | R\$ 14.248,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 14248 | 0 | 0 |
| 6.2.5 | 103315 | SINAPI PI 2024- 10 | MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 11,75 | R\$ 168,89 | R\$ 211,16 | R\$ 2.481,13 | 11,75 | 2481,13 | 0 | 0 |
| 6.2.6 | 98509 | SINAPI PI 2024- 10 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 21,00 | R\$ 88,11 | R\$ 110,16 | R\$ 2.313,36 | 21 | 2313,36 | 0 | 0 |
| 6.2.7 | 98510 | SINAPI PI 2024- 10 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 10,00 | R\$ 129,30 | R\$ 161,66 | R\$ 1.616,60 | 10 | 1616,6 | 0 | 0 |
| 6.2.8 | 98511 | SINAPI PI 2024- 10 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 3,00 | R\$ 242,21 | R\$ 302,83 | R\$ 908,49 | 3 | 908,49 | 0 | 0 |
| 6.3 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ 84.528,11 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1 | C011 | Lic_Propria (própria) | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN32MM(1"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6,00 | R\$ 24,67 | R\$ 30,84 | R\$ 185,04 | 6 | 185,04 | 0 | 0 |
| 6.3.2 | C012 | Lic_Propria (própria) | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN32MM(1"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PEAD ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, UN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70,00 | R\$ 10,45 | R\$ 13,06 | R\$ 914,20 | 70 | 914,2 | 0 | 0 |
| 6.3.3 | C013 | Lic_Propria (própria) | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN32MM(1"). APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180,00 | R\$ 14,92 | R\$ 18,65 | R\$ 3.357,00 | 180 | 3357 | 0 | 0 |
| 6.3.4 | C014 | Lic_Propria (própria) | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14,00 | R\$ 19,73 | R\$ 24,66 | R\$ 345,24 | 14 | 345,24 | 0 | 0 |
| 6.3.5 | C015 | Lic_Propria (própria) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI- CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 165,00 | R\$ 4,91 | R\$ 6,13 | R\$ 1.011,45 | 165 | 1011,45 | 0 | 0 |
| 6.3.6 | C016 | Lic_Propria (própria) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI- CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700,00 | R\$ 7,27 | R\$ 9,08 | R\$ 6.356,00 | 700 | 6356 | 0 | 0 |
| 6.3.7 | C017 | Lic_Propria (própria) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI- CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 340,00 | R\$ 10,30 | R\$ 12,87 | R\$ 4.375,80 | 340 | 4375,8 | 0 | 0 |
| 6.3.8 | C018 | Lic_Propria (própria) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI- CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 870,00 | R\$ 16,53 | R\$ 20,66 | R\$ 17.974,20 | 870 | 17974,2 | 0 | 0 |
| 6.3.9 | C019 | Lic_Propria (própria) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI- CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20,00 | R\$ 25,98 | R\$ 32,48 | R\$ 649,60 | 20 | 649,6 | 0 | 0 |
| 6.3.10 | C020 | Lic_Propria (própria) | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOC, PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R\$ 31,93 | R\$ 39,92 | R\$ 199,60 | 5 | 199,6 | 0 | 0 |
| 6.3.11 | C021 | Lic_Propria (própria) | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOE, PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 | R\$ 30,22 | R\$ 37,78 | R\$ 302,24 | 8 | 302,24 | 0 | 0 |
| 6.3.12 | C022 | Lic_Propria (própria) | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOF, PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R\$ 42,25 | R\$ 52,82 | R\$ 105,64 | 2 | 105,64 | 0 | 0 |
| 6.3.13 | C023 | Lic_Propria (própria) | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R\$ 3.937,54 | R\$ 4.923,10 | R\$ 4.923,10 | 1 | 4923,1 | 0 | 0 |
| 6.3.14 | C024 | Lic_Propria (própria) | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | R\$ 12,41 | R\$ 15,51 | R\$ 62,04 | 4 | 62,04 | 0 | 0 |
| 6.3.15 | C025 | Lic_Propria (própria) | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R\$ 13,65 | R\$ 17,06 | R\$ 17,06 | 1 | 17,06 | 0 | 0 |
| 6.3.16 | C026 | Lic_Propria (própria) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R\$ 77,07 | R\$ 96,36 | R\$ 96,36 | 1 | 96,36 | 0 | 0 |
| 6.3.17 | C027 | Lic_Propria (própria) | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45KA, 175V, TIPOAC-FORNECIMENTO E CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², NÃO | UND | 4,00 | R\$ 110,60 | R\$ 138,28 | R\$ 553,12 | 4 | 553,12 | 0 | 0 |
| 6.3.18 | C028 | Lic_Propria (própria) | ENTERRADA, COM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15,00 | R\$ 90,05 | R\$ 112,58 | R\$ 1.688,70 | 15 | 1688,7 | 0 | 0 |
| 6.3.19 | C029 | Lic_Propria (própria) | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R\$ 143,69 | R\$ 179,65 | R\$ 898,25 | 5 | 898,25 | 0 | 0 |
| 6.3.20 | C030 | Lic_Propria (própria) | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 5,00 | R\$ 44,68 | R\$ 55,86 | R\$ 279,30 | 5 | 279,3 | 0 | 0 |
| 6.3.21 | C031 | Lic_Propria (própria) | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA I800W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 | R\$ 35,03 | R\$ 43,79 | R\$ 350,32 | 8 | 350,32 | 0 | 0 |
| 6.3.22 | C032 | Lic_Propria (própria) | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA | UND | 13,00 | R\$ 78,23 | R\$ 97,81 | R\$ 1.271,53 | 13 | 1271,53 | 0 | 0 |
| 6.3.23 | C033 | Lic_Propria (própria) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM | UND | 17,00 | R\$ 174,30 | R\$ 217,92 | R\$ 3.704,64 | 17 | 3704,64 | 0 | 0 |
| 6.3.24 | 97886 | SINAPI PI 2024- 10 | ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 17,00 | R\$ 174,30 | R\$ 217,92 | R\$ 3.704,64 | 17 | 3704,64 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------|--|-------|---------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------|---|---|
| 6.3.26 | C034 | Lic_Propria (própria) | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPOC-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6,00 | R\$ 2.810,63 | R\$ 3.514,13 | R\$ 21.084,78 | | | | |
| 6.3.27 | C035 | Lic_Propria (própria) | CIRCULAR 200/10, TIPOC-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R\$ 3.574,17 | R\$ 4.468,78 | R\$ 8.937,56 | | | | |
| 6.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R\$ 2.169,67 | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | 89356 | SINAPI PI 2024- 10 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 29,46 | R\$ 21,08 | R\$ 26,35 | R\$ 776,27 | 29,46 | 776,271 | 0 | 0 |
| 6.4.2 | 89357 | SINAPI PI 2024- 10 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28,55 | R\$ 28,88 | R\$ 36,10 | R\$ 1.030,65 | 28,55 | 1030,655 | 0 | 0 |
| 6.4.3 | 89362 | SINAPI PI 2024- 10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | R\$ 8,56 | R\$ 10,70 | R\$ 32,10 | 3 | 32,1 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 89366 | SINAPI PI 2024- 10 | SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | R\$ 14,49 | R\$ 18,11 | R\$ 54,33 | 3 | 54,33 | 0 | 0 |
| 6.4.5 | 89364 | SINAPI PI 2024- 10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | R\$ 10,58 | R\$ 13,22 | R\$ 13,22 | 1 | 13,22 | 0 | 0 |
| 6.4.6 | 89400 | SINAPI PI 2024- 10 | 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | R\$ 17,88 | R\$ 22,35 | R\$ 44,70 | 2 | 44,7 | 0 | 0 |
| 6.4.7 | 103953 | SINAPI PI 2024- 10 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | R\$ 6,60 | R\$ 8,25 | R\$ 8,25 | 1 | 8,25 | 0 | 0 |
| 6.4.8 | 86913 | SINAPI PI 2024- 10 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | R\$ 56,03 | R\$ 70,05 | R\$ 210,15 | 3 | 210,15 | 0 | 0 |
| 6.5 DRENAGEM R\$ 47.401,97 | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | 89512 | SINAPI PI 2024- 10 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 47,91 | R\$ 39,10 | R\$ 48,88 | R\$ 2.341,84 | | | | |
| 6.5.2 | 102711 | SINAPI PI 2024- 10 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 8,00 | R\$ 63,09 | R\$ 78,88 | R\$ 631,04 | | | | |
| 6.5.3 | C009 | Lic_Propria (própria) | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPAS EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | UND | 2,00 | R\$ 817,92 | R\$ 1.022,64 | R\$ 2.045,28 | | | | |
| 6.5.4 | C010 | Lic_Propria (própria) | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 359,19 | R\$ 93,30 | R\$ 116,65 | R\$ 41.899,51 | | | | |
| 6.5.5 | 89554 | SINAPI PI 2024- 10 | LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 16,00 | R\$ 24,20 | R\$ 30,25 | R\$ 484,00 | | | | |
| 6.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R\$ 14.701,50 | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | 100984 | SINAPI PI 2024- 10 | CARGA, MANUBRIA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / III HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020 | M3 | 450,00 | R\$ 8,54 | R\$ 10,67 | R\$ 4.801,50 | 50 | 533,5 | 0 | 0 |
| 6.6.2 | 95877 | SINAPI PI 2024- 10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4500,00 | R\$ 1,76 | R\$ 2,20 | R\$ 9.900,00 | 500 | 1100 | 0 | 0 |
| Total Geral: R\$ 1.425.944,63 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 343960,08 | 0 | 0 | 0 |

André José Santos Alves
